

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DEPARTAMENTI I ZHVILLIMIT DHE MENAXHIMIT TË ASETETEVE

Nr. 6302/4 Prot.

Tiranë, më 21.09/2026

Lënda: Informacion plotësues i shkresës nr. 580/13 Prot., datë 04.08.2026.

ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË ✓

(Rr. "Irfan Tomini", Njësia Administrative Nr. 7, Tiranë)

Për dijeni:

Z. Ervis HAZIZI
Zyrtari i Pajtueshmërisë, OSSH sh.a
Këtu

Të nderuar,

Në vijim të shkresës, me Nr.6302/3. Prot., datë 18.08.2026, dhe në funksion të plotësimit të informacionit lidhur me realizimin e planit të investimeve, klasifikimin si kosto operative apo kosto kapitale të zërave "Mbikëqyrje punimesh / Mbikëqyrje supervizimi" "Oponencë, leje ndërtimi, shpronësime" dhe "Emergjencia", si dhe mënyrën e publikimit dhe informimit të palëve të interesuara, ju përcjellim në vijim informacionin plotësues.

Realizimi i planit 5 vjeçar 2023-2027 të investimeve

PLANI SAJEÇAR I INVESTIMENE 2023-2027										"Plani 5 vjeçar 2023-2027 dhe realizimet", deri në Gusht 2026	
Plani i përditësuar										REALIZIMET E VITEVE	
№/Viti ndryshimit	Emërtimi i Investimit	Qyteti/Komuna/Zona OSSH	Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)	% Realizimi	Statusi i Investimit
I	Ndërtim/rikonstruktion elektrik për Nënstacionet		60,000,000	545,000,000	1,907,000,000	2,913,000,000	1,762,000,000	4,680,000,000	11,867,000,000		
1	Fuqizimi I N/stacionit 110/20 kV Golem - Durrës	Ossh	30,000,000	135,000,000	40,000,000				205,000,000	100%	Perfunduar ne 2024
2	Ndërtimi I nestacionit të ri Velipoje 110/35/20 kV	Ossh	30,000,000	140,000,000	180,000,000	100,000,000			450,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
3	Fuqizimi i N/stacionit 110/20 kV Zogu Zi ((2x40)MVA	Ossh		50,000,000	350,000,000	250,000,000			650,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
4	Ndërtim N/stacionit të ri Fier 2 110/20 kV	Ossh		50,000,000	250,000,000	300,000,000			600,000,000	99%	Ne pritje te energjizimit nga ana e OST
5	Rikonstrukcion dhe fuqizimi i N/stacionit Kuçove 110/35/20/10/6 kV	Ossh		50,000,000	300,000,000	300,000,000			650,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
6	Rikonstrukcion I N/stacionit Pogradec 110/35/10 kV në 110/35/10/20 kV	Ossh		50,000,000	150,000,000	150,000,000			350,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
7	Rikonstrukcion dhe fuqizimi i N/stacionit Corovode e Re 110/35/10 kV	Ossh		30,000,000	30,000,000	90,000,000			150,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
8.2024	Rikonstrukcion i N/stacionit Kafaraj 110/35/10 kV	Ossh			100,000,000	300,000,000	200,000,000		600,000,000	83%	Pezulluar per shkak te sezonit turistik
9.2024	"Ndërtimi i N/stacionit të ri Akerni 110/35/20 kV dhe zhvillimi i linjës 35 kV N/stac Akerni- Aeroporti Vlores"	Ossh			127,000,000	200,000,000	100,000,000		427,000,000	0%	Ne pritje te lejes se punimeve
10.2026	Fuqizimi i N/stacionit 35/6 kV Pallati Kongreseve transformatorët 35/20 kV (2x15)MVA	Ossh						305,000,000	305,000,000		
11.2026	Rikonstrukcion N/Stacioni I Hec Lanabregas 35/10 kV dhe fuqezimi me transformatore 35/20 kV (1x15)MVA	Ossh						200,000,000	200,000,000		

12.2026	Ndërtimi i N/stacionit Fushë Krujë 110/20 kV (Zevendesimi i n/st. Mobile) Transformatorore ONAN/ONAF 40/50MVA	Ossh							285,000,000	285,000,000		
13.2026	Rikonstruksion N/stacioni 110/20/6 kV Shkodra -1, 1x40/50MVA, trakt 110 kV impianti TM, ndërtësë e re, punime civile etj	Ossh					280,000,000		200,000,000	480,000,000		
14.2026	Rikonstruksion i impiantit 20 kV N/stacioni Bushati 110/20 kV	Ossh							55,000,000	55,000,000		
15.2023	Rikonstruksion i N/stacionit Lezhe nga 110/10 kV në 110/20/10 kV	Ossh		40,000,000	80,000,000	90,000,000				210,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
16.2026	Ndërtim i N/stacioni Lozhan 110/35/10 kV 25MVA dhe linja 110 kV	Ossh								245,000,000		
17.2026	Rikonstruksion N/stacioni 35/10 kV Grapsh në 110/20/10 kV dhe ndërtimi i linjës 110 kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Ossh								340,000,000		
18.2026	Rikonstruksion N/stacioni 35/10 kV Delvine në 110/20/10 kV dhe ndërtimi i linjës 110 kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Ossh								340,000,000		
19.2026	Ndërtim i N/Stacioni të ri Xare 110/20/10 kV	Ossh			100,000,000	300,000,000	200,000,000			600,000,000	85%	Proces realizimi
20.2024	Ndërtim i N/Stacioni të ri Piqeras 110/20/10 kV	Ossh			100,000,000	200,000,000	100,000,000			400,000,000	45%	Proces realizimi
21.2024	Ndërtimi i N/stacionit të ri Maskollat 35/10 kV si dhe furnizimi me linje 35 kV nga n. stacioni B.Curri	Ossh								350,000,000		
22.2026	Rikonstruksion i N/stacionit Kinostudio 110/35/20 kV, 1x 40/25MVA.	Ossh						250,000,000	300,000,000	550,000,000	0%	Ne proces prokurimi
23.2026	Ndërtimi i N/stacionit Uzina Dinamo 35/20 kV Transformatorore ONAN/ONAF 40/50MVA	Ossh							480,000,000	480,000,000		
24.2026	Ndërtimi i N/stacionit Tamare 35/20/10 kV dhe linja e re 35 kV nga n. stacioni Vuk Palaj 35/20/10 kV	Ossh								0		
25.2026	Ndërtimi i linjës re 35 kV N.St Vukpalaj - Tamare, dhe N.Stacion i ri 35/10 kV në Tamare.	Ossh				200,000,000	260,000,000			460,000,000	4%	Dorezuar vetem projekti sipas kontrates, ne prite te lejes se punimeve
26.2025	Ndërtimi i n. st. të ri Shëngjim 110/20 kV	Ossh								600,000,000		
27.2026	Rikonstruksion i N. st. Plasmas 110/35/20/6 kV	Ossh							205,000,000	205,000,000		

[illegible]

10.2025	Ndërtimi i linjës 35 kV N/St 220 kV Elbasan - Mjekes - Cerruje - Gramsh.	Ossh				200,000,000	200,000,000	200,000,000	600,000,000	1%	Dorezuar vetem projekti sipas kontratës, në pritje të lejes së punimeve
11.2025	Ndërtimi i linjës 35 kV Kavajë - Rrogozhinë, shtylla me 2 qarqe, (1x240mm ²)	Ossh					300,000,000		300,000,000	0%	Në proces prokurimi
12.2026	Rikonstruksion Linja 35 kV Puke - Koman	Ossh						74,200,000	74,200,000		Në proces prokurimi
13.2026	Spostimi i linjës ajrore 35kV, L30-52 Valias - Vore,	Ossh							7,200,000	0%	Në proces prokurimi
14.2026	Ndërtimi i linjës 35 kV, 1x120mm ² , Bogë - Theth	Ossh						250,000,000	200,000,000		Në proces prokurimi
III	Ndërtim Rrjeti TM							113,490,503	814,000,000	3,931,950,773	
1.2026	Zhvillimi i fiderit TM 20 kV E11 N/st Farke deri tek kabina K8 (Eklips)dhe kabina K13 deri në kabinën K12 (E10).Kabinat elektrike dhe linjat TU me përcjellës ABC. Lidhja në unazë e fiderit E11 e n/st Farke me Fiderin E10 N/st Farke	Tiranë				250,000,000			250,000,000	100%	Perfunduar në 2026
2.2024	Kalimi nga 6 kV në 20 kV i kabinave të fiderit 23 të N/stacionit Selltë	Tiranë				17,230,559			17,230,559	100%	Perfunduar në 2025
3.2024	Linja TM 20 kV zëvendësimi i fiderit 34 dhe E5,nga Stermasi në drejtim të Vishnjës,Arbane, N/ST FARKE-TIRANË Lati II	Tiranë					170,000,000		170,000,000	78%	Proces realizimi
4.2025	Zhvillimi i kolektorit kabllor,tunel kabllor për sistemin e kabllorve që dalin nga nst Rajonal 220/35/20 kV	Tiranë					100,000,000		100,000,000	40%	Proces realizimi
5.2025	Eliminimi i ishujve 6/10 kV dhe kalimi i tyre në rrjetin 20 kV në Rajonin Tiranë në N/Stacionet TEC Kombinat 35/6 kV,N/St Dinamo, Vore,Mezez dhe Farke	Tiranë					60,000,000		60,000,000	80%	Proces realizimi
6.2025	Zëvendësimi me 20 kV të fiderave Mezes 107 etj. me furnizim nga fideri 32 Kashar	Tiranë							61,798,937	100%	Perfunduar në 2024
7	Kalimi i fiderit 118 N/Stacioni Kinostudio 36/9 kV, në rrjetin e ri TM 20 kV.	Tiranë							51,691,566	100%	Perfunduar në 2024

8	Ndërtimi i rrjetit TM 20 kV, ndërtimi i kabinave të reja, rikonstruktion i kabinave ekzistuese të N st. Valias 110/20 kV	Tiranë						0	483,000,000	483,000,000		Ne faze prokurimi
9.2026	Ndërtimi i kotektoreve kabllor për zhvillimin e linjave kabllorë 20kv qe do të dalin nga N/St Kamez (Valias) 110/20 kV.	Tiranë						117,000,000		117,000,000	0%	Ne faze prokurimi
10.2026	Zhvillimi i rrjetit shperndares 20 kV në zonën e City -Park Vore - Rinas	Tiranë							362,000,000	362,000,000		
11.2024	Zhvillimi i 2 fiderave të rinj 336/1 dhe 325/1 nga N/Stacioni Selite 110/20 kV për uljen e ngarkesave të fiderave 334 me 336 dhe 325 me 337	Tiranë						80,000,000		80,000,000	0%	Ne faze prokurimi
12.2024	Zhvillimi i 2 fiderave të rinj C21 dhe C14/1 nga N/Stacioni Traktora 110/20/6 kV, për uljen e ngarkesave në fiderat C14 me L11 dhe linje e dedikuar për Parlamentin	Tiranë						65,000,000		65,000,000	0%	Ne faze prokurimi
13.2026	Zhvillimi i 2 fiderave të rinj T15 dhe T20 nga N/Stacioni Kombinat 110/20 kV për uljen e ngarkesave të fiderave T14 me 335 dhe T13 me F13	Tiranë						80,000,000		80,000,000	0%	Ne faze prokurimi
14.2026	Ndërtimi i Kolektorit dhe zevendesimi i kabllorëve TM të fiderave F7 dhe F8 N/Stacioni Kashar në autostradën Tiranë - Durrës	Tiranë						65,000,000		65,000,000	0%	Ne faze prokurimi
15.2026	Ndërtimi i kabinave të reja 20 kV dhe lidhja unazore e fiderave në pikat kritike në Rajonin Tiranë në N/Stacionet Farke Qender dhe Kashar, Ndroq	Tiranë						160,000,000		160,000,000	0%	Ne faze prokurimi
16.2024	Rikonstruktion i rrjetit TM të Fiderit Nr 1RD (Klos, Mollas) Nst Radio	Elbasan					86,074,026			86,074,026	100%	Perfunduar ne 2025
17.2025	Rikonstruktion i rrjetit TM të Fiderit Shpatit Nst Mjekes	Elbasan					113,838,965			113,838,965	100%	Perfunduar ne 2025
18.2024	Rikonstruktion i rrjetit TM të fiderit Nr. 3 Gramsh	Elbasan							107,688,890	107,688,890		
19.2024	Rikonstruktion i fiderit 1, N/St Fiber	Elbasan							70,329,090	70,329,090		
20.2026	Rikonstruktion i fiderit 2, N/St Fiber	Elbasan							55,000,000	55,000,000		
21.2026	Kalimi i 4 fiderave të Gurit të Kuq nga 6 kv në 10 kv Pogradeç	Korce						36,000,000		36,000,000	0%	Ne faze prokurimi
22.2024	Rikonstrukcioni i Fiderit Potomit, 10 kV N/Stacioni Corovode 35/10 kV	Berat					37,360,702			37,360,702	100%	Perfunduar ne 2026

23.2026	Rikonstrukcion i fiderit Potom 10 kV TM/TU nstacionin Corovode 35/10 kV	Berat					50,000,000	75%	Proces realizimi
24.2025	Rikonstrukcioni i Fiderit Nr.3, 10 kV N/Stacioni Bicukas. 35/10 kV	Berat		14,459,685			14,459,685	100%	Perfunduar ne 2025
25.2024	Rikonstrukcioni i Fiderit Nr.9, 10 kV N/Stacioni Mertish. 35/10 kV	Berat		15,410,354			15,410,354		
26.2026	Ndërtimi i kolektorit i daljes se fiderave nga N/Stacioni Kucove 110/35/10/6 kV	Berat					0		
27.2025	Zgjatimi i Fiderit F.11, N/Stacioni 110/20 kV Fieri i Ri	Fier		75,000,000			75,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
28.2025	Daljet e Fiderave nga N/ST Fieri I ri Nr. 2 110/20 kV të cilat do të lidhen unaze me Fiderat e N/ST Fieri I ri 110/20 kV Mbroshtar + 1 Fider	Fier			150,000,000		150,000,000	50%	Proces realizimi
29.2026	Rikonstrukcion i segmenteve të fiderave kabllore 20 kV, F6, F16, F17, N/Stacioni 110/35/20/10/6 kV Shkodra 1	Shkodër		14,900,000			14,900,000	100%	Perfunduar ne 2025
30.2026	Sistemim i daljeve të fiderave TM 10 kV, F-Rape, Parku, Gjergjan, N/St Fushe Ares	Shkodër				5,468,000	5,468,000		
31.2026	Ndërtim kolektorit për spostimin e fiderave dales të N/stacionit 110/20/10 kV, Lezhe	Shkodër			12,000,000		12,000,000	0%	Ne proces leje punimeve
32.2026	Sistemim i segmentit TM të fiderit ekzistues F15 si dhe Fideri I ri 20 kV F 3 N/St 110/20/6 kV Shkodra 2	Shkodër			117,000,000		117,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
33.2024	Rikonstrukcion i Fiderave Bazë Ulez N/ST Ulez Aghensia Burrel, Drejtoria Rajonale Burrel në rrjetin 10 kV	Burrel				93,000,000	93,000,000		
34.2025	Rikonstrukcion rrjeti TM, 10 kV, Fideri F8 Has	Kukes				35,000,000	35,000,000		
35.2025	Rikonstrukcion i fiderit Lekbibaj ndarja e Geghyesit në fider të ri	Kukes				95,000,000	95,000,000		
36.2026	Rikonstrukcion rrjeti TM, 10 kV, Fideri F6 Has	Kukes				36,000,000	36,000,000		
37.2026	“Zhvillimi i rrjetit Elektrik 20 kV për përmirësimin e cilësisë së furnizimit të zonave perqitate rruges se Arbrit dhe furnizimi i Tunelit të Murizit”	Tiranë		296,000,000			296,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
38.2026	Ndërtimi i dy fiderave të Rinj F33 dhe F34 nga N/Stacioni Kashar 110/20KV dhe rikonstrukcion e kabinave ekzistuese K16 F27 dhe K13 F 28 për uljen e ngarkesave të fiderave F27 dhe F28	Tiranë			90,000,000		90,000,000		Ne pritje te lejes se punimeve

30.06.2026	Zgjatimi i fiderit 20 kV, F7 dhe lidhja në unazë me F14 nëstacioni Kashar si dhe ndërtimi i një pike shpërndarese	Tiranë				65,000,000			65,000,000	99%	65,000,000	Proces realizimi
40.06.2026	Kalimi nga 6 kV në 20 kV I njollave të errëta në qytetin e Shkodrës,Fideri 9 N/St SH-2,Fideri 24,Fideri 21 N/St SH-1	Shkodër					100,000,000			0%	100,000,000	Ne fazë prokurimi F.L
41.06.2026	Lidhja unazore fiderat F 18 dhe F 19,Nst 110/20/10 kV Lezhe	Shkodër					38,700,000			0%	38,700,000	Proces caktimi mbikqyresi
IV	Ndërtim/Rikonstruksion Rrjeti TM /TU		30,000,000	1,507,704,405	4,908,049,114	3,558,533,375	2,456,675,675				15,773,408,620	
1	Faza e dytë e zgjerimit dhe rikonstruksionit të Fiderit E 10 në zonën e Berzhites së bashku me rrjetin Tu me përcjellec ABC	Tiranë		40,000,000	50,000,000	70,000,000				100%	160,000,000	Perfunduar ne 2024
2	Fider I ri 20 kV E 13 I N/stacionit Farke 110/20/10 kV	Tiranë		48,800,160						100%	48,800,160	Perfunduar ne 2024
3	Linje TM 20 kV dhe ABC në vazhdim të fiderave të rinj Vore	Tiranë		42,310,269	50,000,000					100%	92,310,269	Perfunduar ne 2024
4.2026	Zgjatimi I fiderit E11 (20 kV) N/Stacion Farke 110/20/10 kV Loti III Linje TM ajrore dhe rrjet TU me përcjelles ABC në drejtim të Baldushkut për heqjen e kabinave të fiderit E5 (10 kV) N/Stacion Farke.	Tiranë							65,000,000		65,000,000	
5.2024	Ndërtimi i kabinave të reja Shtyllore dhe linjat përkatëse TM dhe linjat tu me kabëll abc në fiderat F1,F2 dhe linjat F3 të N/stacionit 35/6 kv Ndroq	Tiranë			110,000,000					100%	110,000,000	Perfunduar ne 2025
6	Ndërtimi i 12 kabinave të reja Shtyllore dhe linjat përkatëse TM në Fiderin F4 TË N/Stacionit 35/6 KV NDRQOQ si dhe linjave TU me kabëll ABC i 18 kabinave	Tiranë		96,676,817						100%	96,676,817	Perfunduar ne 2024
7	Ndërtimi I kabinave dhe linjave TM 20 kV me furnizim nga fideri R3 I N/stacionit Vore dhenga fiderat F8 dhe F32 të N/stacionit Kashar, të cilët do të zëvendësojnë kabinat 6 kv të fiderit Gjokaj të N/stacionit Vore.	Tiranë		50,000,000	76,660,026					100%	126,660,026	Perfunduar ne 2024
8.2024	Ndërtimi I 2 Kabinave të reja 20 kV dhe rrjet TU me kabel ABC në fiderin Q1 dhe Q2	Tiranë		0	30,000,000					100%	30,000,000	Perfunduar ne 2025
9.2024	Zhvillimi I rrjetit TM 20 kV,Fidera të rinj I8 dhe I9 N/St. Ibc. Kabinat elektrike dhe linjat TU me përcjelles ABC.	Tiranë			180,000,000					100%	180,000,000	Perfunduar ne 2025

10.2024	Zhvillimi i fiderit të ri 20 kV 330/1 nga N/Stacioni Selite për uljen e ngarkesës së fiderit 330(N/Stacioni Selite) në unazë me fiderin L17 (N/Stacioni Qender)	Tiranë			18,000,000					18,000,000	100%	Perfunduar në 2025
11.2024	Kalimi nga 6 kV në 20kV i Fiderit 91 dhe Fiderit 75, N/Stacioni Traktora.	Tiranë			25,300,000					25,300,000	100%	Perfunduar në 2025
12.2024	Rikonstruktion i kabines Zgafnur dhe ndërtimi i rrejtit TU me perçjelles ABC, Fideri 142 N/Stacioni Vallas.	Tiranë			13,000,000					13,000,000	100%	Perfunduar në 2025
13.2024	Zhvillimi i lidhjes unazore 20 kV, të fiderave F16 dhe F17 (N/Stacioni Kashar)	Tiranë			3,680,000					3,680,000	100%	Perfunduar në 2025
14.2024	Zhvillimi i fiderit të ri 20 kV, Z17 nga N/Stacioni Zogu I Zi, për uljen e ngarkesave të Fiderit 321 (N/Stacioni Selite) në unazë me Fiderin L3 (N/Stacioni Qender).	Tiranë			18,000,000					18,000,000		Fond i padeleguar për arsye mos marrje leje për çarjen e rruges)
15.2024	Zhvillimi i rrejtit TM 20 kV, Fiderit T8, Nistac Kombinat 110/20 kV, për furnizimin e TED A	Tiranë			33,000,000					33,000,000	100%	Perfunduar në 2025
16.2024	Ndërtimi i fiderave të rinj, P6, P7, P8, P10, P11 dhe P12, 20 kV, që dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve" 35/20 kV-Tiranë	Tiranë							144,498,280	144,498,280		
17.2026	Ndërtimi i linjës TM kablore 20 kV dhe kabines se re boks 20/0.4 kV si dhe linja TU me kabell me vetembajtje ABC, për furnizimin e lagjes Sharre	Tiranë							20,756,450	20,756,450		
18.2026	Ndërtimi i fiderave të rinj, P1, P2, P3, P4 dhe P5, 20 kV, që dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve" 35/20 kV-Tiranë	Tiranë							64,289,525	64,289,525		
19.2026	Ndërtimi i kabines PSH 16/1 si dhe linjat e rrejtit TU me kabell ABC, me furnizim nga fideri F8, N/St. Kashar	Tiranë				13,533,267				13,533,267		
20	Furnizim me TM 20 kV I kabines se re Murature "Boia e Luleve", fideri F.29, N/St. Kashar 110/20 kV	Tiranë				3,708,518				3,708,518		Punë me punonjësit tane
21	Zevendesimi i daljeve të para kablore të fiderave 6 kV, N/St Vore (me punonjësit tane)	Tiranë				2,673,812				2,673,812		Punë me punonjësit tane
22	Ndërtim i linjës dhe kabines se re Shyllore "Lagia Varosh" si dhe linja TU me kabell me vetembajtje ABC	Tiranë							5,637,580	5,637,580		

23.2026	Kalimi i fiderit C6 nga linja ajrore në kabllore I kabina elektrike Pasho Hysi, Anxhelo Kaza, Iris Dollaku 2 A.I. Dollaku 1, si dhe rrjeti TU I kabines K2, Pasho Hysi në NST Traktora	Tiranë	51,212,956						51,212,956	100%	Perfunduar ne 2024
24	Furnizimi me TM/TU 20 kV i kabines se re "Box Instituti Qender", Fideri A8, N/St Rajonal, qe do të shërbejë për ndarje ngarkesash (me punonjësit tane)	Tiranë	4,370,639						4,370,639		Pune me punonjësit tane
25	Eliminimi i Fiderit 82, 6 kV dhe furnizimi TM/TU 20/0.4kV i kabines se re "Shkoze 2 Box" (me punonjësit tane)	Tiranë	5,574,471						5,574,471		Pune me punonjësit tane
26	Furnizimi me TM 20 kV dhe TU me kabllo me vetmbajtje ABC i kabinave të reja box KL8, KL9, fideri J10, N/St Traktora	Tiranë		32,000,000					32,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
27.2026	Spostimi dhe sisteminimi i kabines K1, fideri E-6, N/St Farke (me punonjësit tane)	Tiranë	4,130,000						4,130,000		Pune me punonjësit tane
28	Lidhja unazore mes fiderit E3 dhe E10, N/St farke 110/20/10 kV, Tiranë (me punonjësit tane)	Tiranë	3,500,000						3,500,000		Pune me punonjësit tane
29	Spostimi i linjave TM/TU qe ndodhen në aksin e ri rrugor Kashar - Tapize loti I	Tiranë	35,073,289						35,073,289	100%	Perfunduar ne 2024
30.2023	Spostimi i linjave TM/TU qe ndodhen në aksin e ri rrugor Thumane - Kashar loti II	Durres	23,301,107						23,301,107		
31.2023	Zgjatimi i Fiderit 8 me kabina dhe rrjet të ri TU n/Stacioni Fushe Kruje 110/20 kV/(drejtum Bubqit)	Durres	21,158,859	20,000,000				100,000,000	141,158,859	100%	Perfunduar ne 2024
32.2026	Rikonstrukcion Rjrti TM, Kabina, dhe Rrjet T U me Percjellesa Al me Vetmbajtje të Tipit "ABC" Spille N/St 35/6 KV Ballaj	Durres		210,000,000					210,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
33	Investim në rrjetin rrjetin TU 20 kV N/St Kavajë si dhe Zgjerim rrjeti 20 kV si dhe Nderim Kabine Elektrike dhe Nderim Rrjeti T U për zonën e Golemit,	Durres						96,500,000	96,500,000	45%	Proces realizimi
34.2024	Zgjerim rrjeti 20 kV, Nderim Kabine Elektrike dhe Nderim Rrjeti T U për zonën e Nikles N/St 110/20 kV Fushe Kruje	Durres						71,943,075	71,943,075	45%	Proces realizimi
35.2025	Rikonstrukcion rrjeti TM-TU në zonat problematike të qytetit Durres dhe Shijakut	Durres		122,000,000					122,000,000		

36.2025	Investim në rrjetin rrjetin TM., TU 10 kV N/St Rrogozhinë (shoqërohet me liste analitike kabineve)	Durrës					65,000,000			65,000,000	65%	Proces realizimi
37.2024	Furnizimi me energji elektrike i Parkut Teknologjik DURANA	Durrës					35,000,000			35,000,000	40%	Proces realizimi
38.2025	Zhvillim i Fiderit të ri nr 9 Nst 110/20 kV Golem me Kabina dhe Rrjet të ri TU	Durrës						129,670,000		129,670,000	0%	Ne faze prokurimi
39.2025	Zhvillimi i rrjetit Tm-Tu në zonat problematike të qytetit Durrës dhe Shijakut (F7 dhe F 9 N/St Spitalle,F 45 dhe 54 shkzort, F1, F 2, si dhe F 8 Nst Sallmone)	Durrës						141,380,000		141,380,000	0%	Ne faze prokurimi
40.2024	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabull ABC dhe I kabinave të Fiderit Nr IRD (Klos,Mollas) Nst Radio	Elbasan				99,706,729				99,706,729	100%	Perfunduar ne 2025
41.2024	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU,kabine, rrjet TU me kabull ABC në agjensine Gramsh	Elbasan				55,000,000				55,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
42.2026	Rikonstruksion I fiderit Nr. 2, fiderit Nr. 3 dhe fiderit Nr. 4, N/St Belsh,	Elbasan							85,352,238	85,352,238		
43.2026	Rikonstruksion I fiderit Nr. 13, Gracen, N/Stacioni Nr. 4dhe rikonstruksion I fiderit Bishqen, N/St Cerrik	Elbasan							80,405,145	80,405,145		
44.2026	Rikonstruksion I fiderit Nr. 3, fiderit Nr. 4 dhe fiderit Nr. 7, N/St Perparim	Elbasan							95,256,565	95,256,565		
45.2026	Rikonstruksion I fiderit Lixha, N/St Mjekes, I fiderit Nr. 6 dhe fiderit Nr. 7, N/St Kajan	Elbasan							109,628,983	109,628,983		
46.2026	Rikonstruksion I fiderit Nr. 6, Tregan,N/St Radio dhe rikonstruksion I fiderit Nr. 8, N/St Banje	Elbasan							88,767,079	88,767,079		
47.2026	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave në rrethinat e Peqinit të Fiderave të Nst Perparim	Elbasan							113,499,754	113,499,754		
48.2025	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave në rrethinat e Elbasanit	Elbasan					280,000,000			280,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
49.2025	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave në rrethinat e Librazhdit	Elbasan					120,000,000			120,000,000	90%	Proces realizimi
50.2026	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave në rrethinat Cerrik të Fiderit Nr.1 Nst Radio	Elbasan						100,000,000		100,000,000	0%	Ne faze prokurimi
51.2026	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave në rrethinat Belsh të Fiderave të Nst Belsh dhe Nst Kajan	Elbasan							180,000,000	180,000,000		

[illegible]

66	Kthim nga Muraturë në Shyllore I kabines "Maling" dhe rikonstrukcion I rrjetit TU me kabell ABC (me punonjesit tane)	Berat	1,559,746							1,559,746		Pune me punonjesit tane
67	Ndërtim I kabines se re "Banaj 4" dhe rikonstrukcion I rrjetit TU me kabell ABC	Berat	4,012,897							4,012,897	100%	Perfunduar ne 2024
68	Ndërtim I kabines se re "Banaj 5" dhe rikonstrukcion i rrjetit TU me kabell ABC	Berat	4,656,526							4,656,526		
69.2024	Ndërtimi I linjës TM dhe kabines se re Prokece Fideri Mbrakull N/ST Polican 35/6KV	Berat	717,793							717,793		
70.2025	Kthimi nga Muraturë në Shyllore I kabines Pompa e ujit Vlashuk FId.Nr7/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV	Berat	354,869							354,869		
71.2024	Rikonstrukcioni I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e Fiderit 26/6KV N/ST Kombinat 35/6KV	Berat		63,407,738						63,407,738	100%	Perfunduar ne 2025
72.2026	Rikonstrukcion I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e fiderit 29/6 kV, N/St Kombinat 35/6 kV.	Berat			90,000,000					90,000,000	99%	Proces realizimi
73.2026	Ndërtim I rrjetit TM, 20 kV, kabines dhe rrjetit TU me kabell ABC në fshatin Vojnik	Berat		16,930,938						16,930,938	100%	Perfunduar ne 2025
74.2024	Rikonstrukcioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC Fideri Nr.5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV si dhe fiderit Nr. 4/10 kV, N/St Pobrat 35/10 kV	Berat							19,589,492	19,589,492		
75.2024	Rikonstrukcion I kabinave dhe rrjetit TU me kabell Abc në kabinat e fiderit Nr. 1/6 kV, N/St Uznove 110/35/6 kV	Berat							24,428,827	24,428,827		
76.2026	Rikonstrukcioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në Agjensine Skrapar	Berat				150,000,000				150,000,000	0%	Ne faze prokurimi
77	Ndërtimi i Fiderit të ri Nr.12/20 kV N/ST Plasmasi 110/20 kV, Kabinave dhe rrjetit Tu me kabell ABC	Berat				200,000,000				200,000,000	0%	Ne faze prokurimi
78	Zhvillimi rrjetit kabllor TM 20 kV OLM 5/1, N/Stacioni Sarande 110/20 kV - Ksamil	Gjrokastrer		210,000,000						210,000,000	100%	Perfunduar ne 2025

79.2026	“ Rikonstruksion rrjeti TM me izolacion 20 kV, kabina dhe rrjet TU me ABC për fshatrat: Vrine, Shendelli, Xarre, Mursi, Konispol, Va galat, Livadhja dhe Finiq”	Gjirokaas ter				310,000,000				310,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
80.2026	Ndërtim rrjet TM, 20 kV, dhe kabina elektrike, fideri F8, F9, F10, N/St Gjirokaas ter. (Zona Kardiaq)	Gjirokaas ter			40,000,000	40,000,000				80,000,000	100%	Perfunduar ne 2024
81.2024	Ndërtimi i linjës kablore 20 kV për furnizimin e tunelit Skarifes	Gjirokaas ter			40,000,000	50,000,000	40,000,000			130,000,000	100%	Perfunduar ne 2024
82.2024	Zgjatim i fiderit F7, 20 kv, Nst Gjirokaas ter 110/20 kv për furnizimin e zonës se Lazaratit	Gjirokaas ter							154,200,000	154,200,000		
83.2025	Ndërtimi i rrjetit TM/TU 20/0.4 kV për fiderat Leffer Talo, Jeta e re nënacioni 35/20/10 kV Livadhja si edhe fideri OLM45 Nënacioni 110/20/10 kV Sarande (pas pikes transformuese 20/10 kV)	Gjirokaas ter							400,000,000	400,000,000		
84.2025	Rikonstruksion kabina dhe linja TU me kabell ABC për fiderat OLM1 dhe OLM 2, Nst Sarande 110/20 kv	Gjirokaas ter				123,000,000				123,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
85	Zhvillimi i rrjetit TM,kabin dhe TU dhe rrjet TU me kabell ABC në drejtorine rajonale Gjirokaas ter (Agjensia Gjirokaas ter, Permet,Tepelen, Delvine, Borsh)	Gjirokaas ter				280,000,000				280,000,000	80%	Proces realizimi
86	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV,Kabina elektrike dhe rrjet TU me ABC në zonën Cuke,Sarande, dhe ndërtim kabina të reja, rrjet TU me ABC në fiderat 3,6,qyteti Sarande	Gjirokaas ter					130,000,000			130,000,000	30%	Proces realizimi
87.2026	Rikonstruksioni i kabinave dhe TU me ABC në fiderin e Kardiaqit në fshatrat Zhulat, Cepune, Taronine,Fushë Bardhe, Golem, Kolonje, Mendar, Prongji, Labove, Andon Poc, Terbuq Hund kuqe)	Gjirokaas ter					70,000,000			70,000,000	25%	Proces realizimi
88.2026	Ndërtim kabine e re Shyllore "Koshovice 3", Tr-160kVA, Linje TM/TU, Fideri Dropull I Siperm, N/St 35/10 kV Grapsh (me punonjesit tane)	Gjirokaas ter			1,600,000					1,600,000		Pune me punonjesit tane
89.2026	Rikonstruksion kabina dhe linja TU me kabell ABC për fiderat Kardiaq dhe Lumzheri, Nst Gjirokaas ter 110/35/6 kv	Gjirokaas ter			45,000,000					45,000,000	100%	Perfunduar ne 2024
90.2026	Rikonstruksion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabell ABC për fiderat Gline, Zagorie Grapsh dhe Dropull i Siperm Nst Grapsh 35/10 kv	Gjirokaas ter							35,000,000	35,000,000		

91.2026	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina linja TU me kabell ABC për fiderat Ujesjelles, Mancaj, Miniera 1, Miniera 2, Nst Menalij 110/6 kv, fiderat Kalaja, Drago Nst Tepelene 110/10 kv, Fiderat Petran-Qytei dhe SMT Nst Permet 110/10 kv dhe Kabina Fushe Libohove, Fideri Zagorie Grapsh	Gjirokas ter							150,000,000		150,000,000	0%	Ne faze prokurimi
92.2026	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina linja TU me kabell ABC për fiderat Krahes Nst Krahes 110/10 kv	Gjirokas ter								35,000,000	35,000,000		
93.2026	Ndërtim linje e re me parametra 20 kv për zonën Bregdet Lukove, Shen Vasil - Nivice	Gjirokas ter								200,000,000	200,000,000		
94	Zgjatim i fiderit OLM8, 20 kv, Nst Sarande 110/20 kv për furnizimin e zonën se Industriale Sarande	Gjirokas ter								85,000,000	85,000,000		
95.2023	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabell ABC për fiderat Ballaban, Suke, Nst Kelcyre 110/10 kv dhe fiderat Kosine, në Nst Permet 110/10 kv	Gjirokas ter								30,000,000	30,000,000		
96.2026	Zgjatim i fiderit OLM6, 20 kv, Nst Sarande 110/20 kv Berdenesh Nr. 5 - Ksamil Nr 13 (furnizimi i zonës Ksamil me linje unazore) dhe zgjatimi i fiderit OLM 5 për furnizimin e zonës PSV (Marine) Ksamil	Gjirokas ter					40,000,000	40,000,000				100%	Perfunduar ne 2024
97.2026	Rikonstrukcioni i kabinave ekzistues 20 Kv dhe rrjetit TU 0.4kv, fideri OLM 5 (Ksami), N/St Sarande 110/20kv	Gjirokas ter					22,107,346					100%	Perfunduar
98.2026	Ndërtim i fiderave dales B1, nga NST I ri Bunec në drejtim të Borshit.	Gjirokas ter							150,000,000			0%	Ne faze prokurimi
99.2025	Ndërtimi i rrjetit TM/TU jashte kooperacionit Italian në zonën e Himares	Vlore										10%	Pezullim si pasoje e sezonit turistik
100.2026	Ndërtimi i rrjetit TM/TU jashte kooperacionit Italian në zonën e Dhermiut	Vlore							200,000,000		0		
101.2024	Zhvillim linje TM (me izolacion 20 kv) kabina dhe linje TU me perçjelles ABC në Qeparo, N/Stacioni 35/10 kv	Vlore					33,000,000					100%	Perfunduar ne 2026
102.2024	Zhvillimi i linjave TM 20 kv kabinave elektrike dhe linjat TU me perçjelles ABC-për fiderat O1 dhe O2 nga N/Stacioni Orrikum 110/35/20 kv për furnizimin me energji elektrike të zonës Radhime.	Vlore					480,000,000					100%	Perfunduar ne 2026

103.202 5	Zhvillimi i linjës TM 20 kV kabineve elektrike dhe linjat TU me perçjelles ABC, për fiderin O4 nga N/Stacioni Oriktum 110/35/20 kV për furnizimin me energji elektrike të zonës Qytet-Oriktum	Vlore						160,000,000	30%	Proces realizimi
104.202 6	Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin KO2, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					22,000,000	22,000,000		
105.202 6	Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin S14, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					20,000,000	20,000,000		
106.202 6	Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin F52, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					86,000,000	86,000,000		
107.202 6	Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin F54, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					58,000,000	58,000,000		
108.202 6	Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin K2, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					62,000,000	62,000,000		
109.202 6	Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin K3, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					22,000,000	22,000,000		
110.202 6	Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin XH7, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					23,573,982	23,573,982		
111.202 6	Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin XH4, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					62,597,148	62,597,148		
112.202 6	Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin XH10, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					74,095,491	74,095,491		
113.202 6	Furnizimi i Aeroportit të Vlores	Vlore				30,000,000	30,000,000		100%	Perfunduar ne 2025
114	Ndërtimi i Fiderave 20 kV L10 N.St. Vlores dhe Fiderit J10 N.St. Vlores për furnizimin e objekteve në Portin e Vlores	Vlore				55,192,960	16,258,755		100%	Perfunduar ne 2024

115.202 4	Rikonstrukcion I rrjetit TM në fiderin KO1, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore								51,878,850	51,878,850			
116.202 6	Rikonstrukcion I rrjetit TM në fiderin KO3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore								81,629,736	81,629,736			
117.202 6	Rikonstrukcion I rrjetit TM në fiderin SE3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore								55,982,877	55,982,877			
118.202 6	Rikonstrukcion rrjeti TM, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC në njollat pa investim në zonën e Bashkisë Vlore	Vlore							160,000,000	160,000,000		0%	Ne proces leje punimesh	
119.202 6	Ndërtimi i linjës kablore 20 kV N.St Orikum - Tuneli Llogarase	Vlore			50,000,000	56,000,000		54,000,000		160,000,000		100%	Perfunduar ne 2024	
120.202 6	Ndërtimi i linjës 20 kV ajrore N.St Palase - Tuneli Llogarase	Vlore			31,000,000	30,000,000				61,000,000		100%	Perfunduar ne 2024	
121	Zhvillimi i linjave TM 20 kV kabinave elektrike dhe linjat TU me perçjelles ABC,per fiderat O3 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20 kV për furnizimin me energji elektrike të zonës Orikum Plazh	Vlore							240,000,000	240,000,000		0%	Ne faze prokurimi	
122	Rikonstrukcioni i kabinave dhe rrjetit TU për Fiderin Fratar, Nënstacioni Pocom 35/6 kV, dhe vazhdimi i kabinave të mbetura të fiderit Aranitas, N/st Pika Shperndarëse Ballsh.	Fier				70,000,000				70,000,000	0	100%	Perfunduar ne 2026	
123.202 6	Ndërtim i kabines se re "Velmish i Ri", linja TM dhe linja TU me kabell me vetmbajtje të upit ABC për këtë kabine	Fier			5,000,000							100%	Perfunduar ne 2023	
124.202 4	Rikonstrukcioni I rrjetit TM dhe rikonstrukcioni I kabinave të mbetura dhe rrjeti TU për Fiderin Pulari 1, Nënstacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier						50,642,300			0	0%	Ne prije te lejes se punimeve	
125.202 6	Rikonstrukcioni I rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderit Pulari 2, Nënstacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier						70,434,000				100%	Perfunduar ne 2026	
126	Rikonstrukcioni I rrjetit TM për fiderat Nr.1,2,3. Cakran, Buzmadh dhe Variboh, N/ST Cakran 35/10/6 kV	Fier				99,850,000						100%	Perfunduar ne 2025	


127.202 6	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Kompresori 1 dhe 2, Nënstacioni Patos 35/6 kV	Fier				104,299,000			104,299,000	99%	Proces realizimi
128.202 6	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Oficine, Nënstacioni Patos 35/6 kV	Fier				78,715,000			78,715,000	100%	Perfunduar ne 2026
129.202 5	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Qyteti 1,2,3, dhe kabinave të mbetura të fiderit Qytet 4, Nënstacioni Patos, 35/6 kV	Fier						100,000,000	100,000,000		
130.202 5	Ndërtimi i Degezimit të ri TM në Fiderin Nr.16 dhe kabines se re Shylllore "Sheq Levani 3", Nënstacioni 35/6 kV Kafaraj (me punonjësit tane)	Fier						4,000,000	4,000,000		
131.202 6	Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabinave dhe Rrjetit TU të fiderit Aranias dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shërnadajës Ballsh, në N/St. TEC 110/35/6 kV	Fier					140,000,000		140,000,000	0%	Ne faze prokurimi
132.202 4	Rikonstruksioni i rrjetit TM/TU për fiderat Ngjekar,Roskovec 3,Strum 4,N/St Matke 35/10 kV	Fier					130,000,000		130,000,000	0%	Ne faze prokurimi
133.202 5	Zgjerimi i Fiderit 12 (nga kabina Vadhize 1 deri në Radostine,Pojan,Ferme)dhe vendosja e kabinave boxdhe rrjeti TU,N/St Fieri I ri 110/20 kV.	Fier					80,000,000		80,000,000	0%	Ne faze prokurimi
134.202 5	Rikonstruksion rrjet TM fideri 19n/st Korce pjesa fshati Drenove, rrjet TU me ABC Fshati Drenove, rikonstruksion kabina Vlocisht 1+2+3+4, rikonstruksion kabina Qyteti i Minatoreve, Drenove 1, Drenove 2 dhe ndërtim kabine e re me Muraturë tulle Drenove 3	Korce				26,200,000			26,200,000	100%	Perfunduar ne 2025
135.202 6	Rrjet TU me kablo me vetëmbajtje ABC Kabina Vlocisht 1+2+3+4, rikonstruksion kabinat Vlocisht 1+2 dhe ndërtim kabine e re Muraturë Vlocisht 3	Korce				21,200,000			21,200,000	100%	Perfunduar ne 2025
136.202 6	Rrjet TU me ABC kabina Zvirine 1+2+3 dhe rikonstruksion kabina Zvirine 1+2+3	Korce				13,600,000			13,600,000	100%	Perfunduar ne 2025
137.202 6	Rrjet TU me kablo me vetëmbajtje ABC Kabina BOROVE, dhe ndërtim kabine e re me Muraturë tulle fshat BOROVE	Korce				2,500,000			2,500,000	100%	Perfunduar ne 2025

138.202 4	Rrjeti TU me kablo ABC I kabinave të fshatit Podgorie, fideri 14, N/St Petrushe, ndërtim kabine Shylllore me dy shtylla, linje TM 10 kV për lidhjen e kabines Shylllore me rrjetin TM nga kabina Podgorie 1	Korce			32,000,000				32,000,000								100%	Perfunduar ne 2025
139.202 4	Rrjet TU me ABC Fshati Areze dhe rikonstrukcion kabina fshati Areze	Korce			6,010,288				6,010,288								100%	Perfunduar ne 2025
140.202 4	Rrjet TU me ABC Fshati Nikolicë dhe ndërtim kabine e re fshat Nikolicë	Korce			2,316,606				2,316,606								100%	Perfunduar ne 2025
141.202 6	Ndërtim I linjes TM, 10 kV, Fideri Nr. 2 Dohoshisht (në punonjesit tane)	Burrel		5,480,713													100%	
142.202 4	Ndërtim kabine dhe rrjeti TU me ABC i kabinave të fshatit Vitkuq, FIDERI Vitkuq, N/St Rehove	Korce			16,450,617				16,450,617								100%	Perfunduar ne 2025
143.202 4	Rikonstrukcion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/St SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/St Fushe Alle,(LOTI 1)	Burrel		14,556,552													100%	Perfunduar ne 2025
144.202 4	Rikonstrukcion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/St SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/St Fushe Alle,(LOTI 2)	Burrel		30,651,460	30,000,000													
145.202 6	Rikonstrukcion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/St SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/St Fushe Alle,(LOTI 3)	Burrel		42,000,000	50,000,000												100%	Perfunduar ne 2025
146	Kalimi nga 10 kV në 20 kV, rrjeti TM, rikonstrukcion I kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC në fiderin 17 (Shëngjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	Shkodër		108,608,000													100%	Perfunduar ne 2024
147.202 4	Kalimi nga 10 kV në 20 kV, rrjeti TM, rikonstrukcion I kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC në fiderin 18 (Shëngjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	Shkodër		151,395,600													100%	Perfunduar ne 2024
148	Rikonstrukcion dhe kalimi në 20 kV I kabines Vasil Shanto, Fideri 17, N/Stacioni 110/20/6 kV Shkodra 1	Shkodër		4,084,915													100%	
149	Sistemi i rrjetit TM/TU & kab. Nr.14 SMT, Lajm i Ri, F-2 (Gurra), N/St 110/10 kV Lezhe	Shkodër		6,595,018													100%	
150	Rikonstrukcion I rrjetit TM/TU me ABC dhe I kabinave të fiderit 15, 6 kV, N/St Shkodra 1	Shkodër														55,788,577		
151.202 6	Rikonstrukcion rrjeti TU dhe kabinave, F-1, N/St 35/6 kV Dobrac	Shkodër														32,507,865		

152.202 3	Rikonstrukcion i rrjetit TM, i rrjetit TU me ABC dhe I kabineve ne Fiderin F3R (Ujesjeltes Ajror Rrile)	Shkoder					118,500,000		118,500,000		0%	Ne faze prokurimi
153.202 3	Vazhdimi i kalimit ne 20 kV rrjeti TM, TM/TU dhe rrjeti TU ne zonën e Berdices, F-9, N/St 110/35/20/6 kV Shkodra 2	Shkoder					39,562,987	39,562,987				
154	Kalimi nga 10 kV ne 20 kV, rrjeti TM, rikonstrukcion i kabineve dhe rrjeti TU me kabell ABC ne fiderin 16 (Shengjin kabllo), N/St 110/10 kV, Lezhe	Shkoder			77,042,574						100%	Perfunduar ne 2024
155.202 6	Fider I ri Nr.5 Nst Bushat I Ri 110/20 kV, Lidhja nazoze me Fiderin Nr.9 Nst Shkodra 2 110/35/20/6 kV	Shkoder						107,000,000	107,000,000			
156	Kalim nga 6 kV ne 20 kV I rrjetit TM, rikonstrukcion i kabineve dhe rrjeti TU me kabllo ABC ne fiderin 21, SH-1	Shkoder				142,000,000					100%	Perfunduar ne 2025
157.202 6	Ndertim i kabines Shtyllore Shenkoll I kab. 10, F-4R, N/St Rrile	Shkoder						3,311,369	3,311,369			
158.202 6	Rikonstrukcion i rrjetit TU dhe kabines Shtyllore Bleran e Re 1, F-5, N/St SH-1	Shkoder				5,068,654					100%	Perfunduar ne 2025
159.202 6	Rikonstrukcion i rrjetit TU dhe kabines murore Muriqan 1, fideri Zues, N/St Zues	Shkoder				6,343,931					100%	Perfunduar ne 2025
160.202 6	Rikonstrukcion i rrjetit TU dhe kabines murore Belaj rrushkull, F-1, N/St Dajc	Shkoder				8,437,150					100%	Perfunduar ne 2025
161.202 6	Ndertimi i kolektorit kabllore nga Puseta P1 deri ne Puseten P10, N/st. Plazh Velipoje 110/20 kV, ndertimi i fiderave kabllore 20 kV F1 dhe F2, Kabinave 20 kV dhe rrjetin TU me ABC te Plazh Velipoje (nga n.st. Velipoje - Kabina Box 22/F1)	Shkoder			52,000,000	140,000,000					100%	Perfunduar ne 2024
162.202 5	Lidhja nazoze e N/Stacioneve Shkodra 2, Fideri 9 dhe N/Stacioni Bushati, Fideri I Ri dhe zhvillimi TM/TU i zonës se Beltojes	Shkoder				100,000,000					100%	Perfunduar ne 2025
163.202 6	Ndertim kabine Shtyllore KML4 dhe KML5 zhvillimi i rrjetit TU i tyre dhe kabines Ndue Ndokaj F-5, F-7, n/dt. Lezhe	Shkoder				9,546,528					100%	Perfunduar ne 2025
164.202 6	Sistemin rrjeti TM/TU & kabines Box Boriq i Madh 2 F-1 N/St Vrake, Koplik	Shkoder				3,005,773					100%	Perfunduar ne 2025

165.202 6	Zhvillimi i linjave TM 20 kV, kabinave 20 kV dhe rrjetit TU me perjelles ABC për fiderat F3 dhe F4 N/Stacioni Velipoje 110/20 kV (nga N/Stacioni Velipoje - Kabina Box 17/F3)	Shkoder				199,000,000			199,000,000	85%	Proces realizimi
166.202 4	Ndërtimi i fiderit kabllorë 20 kV F5, Kabinave 20 kV dhe rrjetit TU me ABC n/st. Velipoje 110/20 kV, (nga n.st. Plazh Velipoje - Kabina Box 15/F5)	Shkoder			217,000,000				217,000,000	82%	Proces realizimi
167.202 6	Rikonstrukcioni rrjeti TM, N/Stacion - Shoshan dhe Shoshan - Valbone, Fideri Ujshells, N/Stacioni 110/10 kV, Bajram Curri	Kukes		40,000,000		40,000,000			80,000,000	100%	Perfunduar ne 2024
168.202 4	Rikonstrukcioni i pjesshem i fiderit Ujshells, N/Stacioni 110/10 kV, Bajram Curri.	Kukes		40,000,000		40,000,000			80,000,000	100%	Perfunduar ne 2024
169.202 4	Furnizimin me energji elektrike të blloqeve të banimit të procesit të rindërtimit në zonën e re për zhvillimin e Spitalles, Bashkia Dures.	Dures				19,727,578			19,727,578	100%	Perfunduar ne 2025
170.202 4	Rikonstrukcioni i rrjetit TM/TU dhe kabinave në fiderat: Agim i NSt Libofshe; 2(Seman) Nst Hoxhare; Mbrostar Ura Nst Fieri 1 dhe fiderit Ferme Nst Fieri 2	Fier				110,000,000			110,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
171	Rikonstrukcioni i rrjetit TM/TU për fiderat 15, 16, 26 Nst Kafaraj si edhe ndërtimi i linjave dhe kabinave të reja TM/TU për furnizimin e serave në zonën e ish Komunes Cakran dhe ish Komunes Frakull	Fier				80,000,000			80,000,000	99%	Ne proces kolauidm dhe marrje ne dorezim
172.202 4	Rikonstrukcioni i rrjetit TM/TU në Drejtorine Rajonale Fier për zonat Roskovec, Patos	Fier				70,000,000			70,000,000	99%	Ne proces kolauidm dhe marrje ne dorezim
173.202 4	Rikonstrukcioni i rrjetit TU dhe kabinave të fiderit Ngjeqan dhe Roskovec 1 Nënstacioni Matke 35/10 kV	Fier			62,000,000				62,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
174.202 4	Zëgjatimi i Fiderit Nr. 12, 20 kV kabina Box 13 + shperndarja TU për 13 kabina (Drize+Vadhize)	Fier							100,000,000	99%	Ne proces kolauidm dhe marrje ne dorezim
175.202 4	Rikonstrukcioni i kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC në kabinat e fiderit Nr. 2/6 kV N/Stacioni Lushnje(Qender) 35/6 kV	Berat				70,000,000			70,000,000	100%	Perfunduar ne 2026

176.202 5	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e fiderit Nr. 11/10 kV dhe Nr.3/10 kV N/Stacioni Bicukas-Divjake 35/10 kV.	Berat			100,000,000						100,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
177	Zhvillimi i rrjetit TU me percejelles ABC, sistemin kabinash në Fiderin 4B dhe Fiderin 6B N/Stacioni Bicukas 35/10 kV	Berat				166,000,000					166,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
178	Zhvillimi i rrjetit TU me percejelles ABC, sistemin kabinash në Fiderin 8 (6 kV) N/Stacioni Plasmas 110/ 35/6 kV (Saver, Krutje e poshteme, Zhymë, Fieri I Ri, Krutje e Sipërme, Gjaze, Ngurez e Madhe dhe e Vogel dhe Arrez)	Berat				110,000,000					110,000,000	99%	Proces realizimi
179.202 4	Zhvillimi i rrjetit TU me kabell ABC, sistemin kabinash në Fiderin Nr.2(10KV) (18kabina), Fideri Nr.3(10KV) (4kabina) dhe Fideri Nr.4(10KV) (12kabina) N/Stacioni Hysgjokaj 35/10KV	Berat				130,000,000					130,000,000	50%	Proces realizimi
180.202 4	Zhvillimi i rrjetit TU me percejelles ABC, sistemin kabinash në Fiderin 5 N/Stacioni Plasmas 110/ 35/6 kV (Zonat Saver, Bishqethem, Shaku, Lumth, Gorre, Rr apes, Pirre dhe kancishi)	Berat				92,000,000					92,000,000	99%	Proces realizimi
181.202 4	"Ndërtimi i një segmenti pusta dhe tuba (pjesë e fiderit 10 kV/8-18 Perpunim Druri, N/St Pogradeç) në rruget e Tushemishtit"	Korce				16,000,000					16,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
182.202 4	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV kabina elektrike rrjet TU me ABC Fiderat 8 N.st Pogradeç dhe ndërtimi i tubave dhe puseteve për dalje të fiderave 2,3,4,8 (Loti 1)	Korce				140,000,000					140,000,000	0%	Ne pritej te lejes se punimeve
183.202 6	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV kabina elektrike rrjet TU me ABC Fiderat 2,3 N.st. Pogradeç (Loti 2)	Korce				218,000,000					218,000,000	0%	Ne pritej te lejes se punimeve
184.202 5	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV kabina elektrike rrjet TU me ABC Fiderat 4 N.st. Pogradeç (Loti 3)	Korce				117,000,000					117,000,000	0%	Ne pritej te lejes se punimeve
185.202 5	Rikonstruksioni i kabinave elektrike të përmbytura në dytetin e Vlores	Vlore				60,736,011					60,736,011	100%	Perfunduar ne 2025
186.202 4	Zhvillimi i rrjetit TU me kabell ABC dhe rikonstruksion i kabinave në Zonat: Zhane Sektor, Thanasaj, Gramsh-Fideri Nr.2 6kV N/stacioni Lushnje_Qender 35/6 kV	Berat				90,000,000					90,000,000	70%	Proces realizimi



7.2024	Ndërtimi i rrjetit të ri TU me ABC për fiderat V4 dhe V5 të N.st. Valias 110/20 kV.	Tiranë					150,000,000		150,000,000	0%	Ne proces prokurimi
8.2024	Investim në rrjetin TU në Krujë/ Fushë Krujë	Durrës				86,000,000			86,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
9.2024	Rikonstruksion i rrjetit TU me ABC Zona Bujqës Elbasan	Elbasan				12,752,160			12,752,160	100%	Perfunduar ne 2025
10.2024	Rikonstruksioni i rrjetit TU të Fiderit Nr.2, 20 kV, Nënstacioni 110/20 kV Fieri i Ri dhe fiderit Ferme N/St Fieri 2	Fier				50,000,000			50,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
11.2026	Rikonstruksioni i rrjetit TU dhe kabinave të Fiderit Strum dhe Roskovec 3, Nënstacioni Matke 35/10 kV	Fier				32,500,000			32,500,000	100%	Perfunduar ne 2025
12.2024	Rikonstruksioni i rrjetit TU për kabinat e fiderave Kute, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.8 dhe Nr.9 Ballsh.	Fier					135,650,000		135,650,000		
13.2024	Rrjet TU me kabllo ABC Fshati Boboshitë kabina Boboshitë 1 Nst Glanc, Fideri Fshat	Korçë				10,086,145			10,086,145	100%	Perfunduar ne 2025
14.2024	Rrjeti TU me kabllo ABC I kabinave të fiderit 8, N/stacioni Bilisht (kabinat e fshatrave të bashkise Pustec)	Korçë				44,000,000			44,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
15.2024	Rrjet TU me ABC fiderat 1,2,3,4,6 dhe 7 N/St Korçë, gjetet KORÇE	Korçë				81,600,000			81,600,000	100%	Perfunduar ne 2025
16.2024	Rrjeti TU me ABC i kabines "Shqitas", N/ST Petrushe, Fideri 11	Korçë				9,000,000			9,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
17.2024	Rrjeti TU me ABC i kabinave të fshatit Symize, Korçë	Korçë				11,100,000			11,100,000	100%	Perfunduar ne 2025
18.2024	Rrjeti TU me ABC i kabinave të fshatit Drihas, N/ST TEC MALIQ, fideri Komunal 2	Korçë				12,674,984			12,674,984	100%	Perfunduar ne 2025
19.2024	Rrjet TU me kabllo ABC gjetet Leskovik Agjensia Erseke, Rajoni Korçë	Korçë				12,615,240			12,615,240	100%	Perfunduar ne 2025
20.2024	Rrjeti TU me ABC i kabinave "Leshnice 1" dhe "Leshnice 2", fideri 14 Cerave, N/ST Petrushe	Korçë				15,233,955			15,233,955	100%	Perfunduar ne 2025
21.2024	Rrjet TU me kabllo ABC Fshati Mborje, kabinat Depot 10IK, Morje 1, Mborje 2	Korçë				14,490,489			14,490,489	100%	Perfunduar ne 2025
22	Rrjet TU me kabllo me vetëmbajtje ABC Kabina Mollas 1, me transformator Sn = 250 kVA, Fideri 3M, N/St Mollas	Korçë				1,317,244			1,317,244	100%	Perfunduar ne 2025

23	Rrjet TU me kabell ABC fshati QINAM Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce		2,046,559							2,046,559	100%	Perfunduar ne 2024
24	Rrjet TU me kabell ABC fshati Selenice Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce		2,696,630							2,696,630	100%	Perfunduar ne 2024
25.2024	Rrjet TU me kabell me vetmbajtje ABC kabina Rehove 1+2	Korce		3,420,379							3,420,379	100%	Perfunduar ne 2024
26.2024	Rrjet TU me kabell ABC fshati Rember, Njësia Korce, Rajoni Korce	Korce						17,200,000			17,200,000	100%	Perfunduar ne 2025
27.2024	Rrjet TU me kabell ABC fshati Bitincke, Agjensia Bilisht, Rajoni Korce	Korce						16,361,294			16,361,294	100%	Perfunduar ne 2025
28.2024	Rrjet TU me kabell ABC fshati Pirq, Njësia Korce, Rajoni Korce	Korce						19,779,857			19,779,857	100%	Perfunduar ne 2025
29.2026	Rrjeti TU me kabell ABC fshati Barc, agjensia Korce, Rajoni Korce	Korce						9,506,418			9,506,418	100%	Perfunduar ne 2025
30.2024	Rrjet TU me ABC Fshati Dishnice, Fideri 21, NST Korce	Korce							30,000,000		30,000,000	0%	Ne proces prokurimi
31.2026	Rrjet TU me ABC Fshati Dvoran, fideri Fshat, Nënstacioni Gjanc Korce	Korce							43,000,000		43,000,000	0%	Ne proces prokurimi
32.2024	Rrjet TU me ABC fshati Porodina, fideri 17, Nënstacioni Korce	Korce							22,000,000		22,000,000	0%	Ne proces prokurimi
33.2026	Rikonstruksioni I Rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e fiderit A1U dhe A4B	Berat						41,859,709			41,859,709	100%	Perfunduar ne 2025
34.2026	Rikonstruksion rrjeti TU me kabell ABC në kabinat "Box1", "Box 2", "Box 3", "Box 4", Fideri 24, N/St SH-1	Shkodër								37,297,930	37,297,930		
35.2024	Zhvillim dhe rikonstruksion rrjeti TU në kabinen "zooteknike 2", F-2, N/St 35/6 kV Dobrac	Shkodër						5,447,450			5,447,450	100%	Perfunduar ne 2025
36.2024	Sistemimi rrjetit TU, kabina Pompa, Fideri Nr. 1, N/St 110/10 kV Lezhe	Shkodër									0		
37.2024	Spostim I rrjetit TU, Kabina Dudaj 2, F- 15, Sh-2	Shkodër									0		
38.2025	Zhvillim Rrjeti TU, Shiroke-Zogaj, Fideri 17, N/St 110/20/6 kV Shkodra 2.	Shkodër							27,000,000		27,000,000	0%	Ne proces prokurimi
39.2025	Rikonstruksion rrjeti TU I kabinave murore dhe Shtyllore "Qender Mes", "Qender Myselim", "Qender Myselim 2", Fideri 15, N/St 110/35/20/6 kV Sh-1	Shkodër						31,077,365			31,077,365	100%	Perfunduar ne 2025

40.2025	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Bicaj, Mustafaj, Brataj Bozhe	Kukes			52,000,000					52,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
41.2024	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Shitqen	Kukes			102,000,000					102,000,000	99%	Ne proces kolaudimi dhe marrje ne dorezim
42.2025	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Terthore	Kukes				100,000,000				100,000,000	70%	Proces realizimi
43.2025	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Cernice	Kukes				25,000,000				25,000,000	99%	Proces kolaudimi dhe marrje ne dorezim
44.2025	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Vranishti dhe ndertim kabine Cenali +Rikonstrukcion rrjeti TM/TU Lagje 1,2,3,7.	Kukes				80,000,000				80,000,000	99%	Proces kolaudimi dhe marrje ne dorezim
45	Rikonstrukcion I pjesshem rrjeti TU me kabell ABC i Fiderave & Mamez, Shemri /Kukes	Kukes					75,000,000			75,000,000	0%	Ne proces prokurimi
46	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV, TU 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne Njesit Peshkopi, Bulqiz, Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat: Kretshinat e Qyteti Peshkopi, Borvjan, Zerqan, Fushe Bulqiz"	Burrel			235,000,000					235,000,000	98%	Proces realizimi
47	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV, TU 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne Njesia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel: Zonat "Fushe Shullaz, Fush Milot, Adriatik"	Burrel				131,000,000				131,000,000	48%	Proces realizimi
48.2026	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV, TU 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne Njesia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel " Zona: Thuman"	Burrel				116,400,000				116,400,000	49%	Proces realizimi
49.2026	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV, TU 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne Njesia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel " Zona: Bushnesh, Dukagin"	Burrel				104,200,000				104,200,000	53%	Proces realizimi
50.2026	Rikonstrukcion i rrjetit TU 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne Njesine Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel "Zona Mamurras-Milot"	Burrel		57,600,000	100,000,000					207,600,000	100%	Perfunduar ne 2024
51.2026	Rikonstrukcion i rrjetit TU 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne Njesine Peshkopi Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Guri I Kuq, Bellova, Pularia"	Burrel		40,200,050	100,000,000					180,200,050	100%	Perfunduar ne 2024

52.2026	Rikonstrukcion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kablë 'A,B,C' në pjesë Bulqize Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Gjorice, Fushë Bulqize,Zerçin,Krast,Trebisht"	Burrel		40,220,000	200,000,000	40,000,000				280,220,000	100%	Perfunduar ne 2025
VII	Teknologji Monitorimi		0	0	10,500,000	0	156,876,000	385,000,000	552,376,000			
1.2026	Automatizimi i komandimit në distance (RTU)	Tiranë						187,000,000	187,000,000			
2.2024	Upgrade Sistemi PoerFactory	OSSH			5,250,000				5,250,000		0%	
3.2024	Modul i administrimit të projekteve	OSSH			5,250,000				5,250,000		0%	
4.2025	Upgrade Sistemi PoerFactory (Team Edition version unlimited, 6-10 users real time, Advanced functions package, Training, Support, maintenance 3 vjet)	OSSH					30,000,000		30,000,000			
5.2026	Konfigurimi dhe integrimi i Seades Lokale të 14 Nënstacioneve në SCAD-E-n qendrore	OSSH					126,876,000		126,876,000			
6.2026	Faza e dyte e instalimit, montimit të sistemit të kontrollit të rrjetit elektrik, kabinave të transformacionit në Durrës si dhe Spostimi në godinën e re	OSSH						198,000,000	198,000,000			
VIII	Investime në matjes		0	115,934,400	443,768,000	480,465,852	830,077,209	0	1,870,245,461			
I	Matesa Lidhje të re, Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kërkesë klienti dhe/ose plane OSSH, Me sistem matje, përfshirë aksesoret e nevojshëm. (23,000 matesa 2023), (50,000 matesa 2024) dhe (50,000 matesa 2025)	OSSH		95,934,400	100,000,000				195,934,400		100%	
2.2024	Matesa Lidhje të re, Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kërkesë klienti dhe/ ose plane OSSH, në sistem matje,përfshirë aksesoret e nevojshëm,(21450 matesa për vitin 2024)	OSSH			274,668,000				274,668,000		100%	
3.2024	Blerje Aparate Testues Etalon (6 aparate)	OSSH			19,100,000				19,100,000		100%	
4.2025	Matesa Lidhje të re, Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kërkesë klienti dhe/ ose plane OSSH, në sistem matje,përfshirë aksesoret e nevojshëm, (2025-2027)	OSSH							375,465,852		20%	
5.2025	Instalim matje on line për 415 fiderat e N.Stacioneve	OSSH							55,000,000		TL	

6	Instalimit të Sistemi i matjes inteligjente të Bilancit të Energjisë në kabinet elektrike TM-TU, në konsumatorët private, Software dhe integrimi i tyre me platformën MDM	OSSH		20,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000			100%	Perfunduar ne 2024
7.2026	Blerje matës, përfshirë aksesoret e nevojshëm	OSSH					397,700,000				
8.2026	Instalimit të Sistemi i matjes inteligjente në konsumatorët fundor, në sistemin e matjes së bilancit të Energjisë në kabinet elektrike TM-TU, Software dhe integrimi i tyre me platformën MDM	OSSH					432,377,209				Ne faze prokurimi
IX	Investime në sistemin e matjes		20,000,000	180,000,000	285,568,298	285,568,298	285,568,298	-			
1	Projekti i Furnizimit dhe instalimit të Sistemi i matjes Smart i Bilancit të Energjisë në kabinet elektrike, Software dhe integrimi i tyre me platformën MDM (Etapa e parë)	OSSH	20,000,000	180,000,000	285,568,298	285,568,298	285,568,298			100%	
X	Blerje Pajisje makineri		0	-	1,597,000,000	1,498,000,000	1,430,000,000	-			
1.2024	Blerje pajisje primare për N/Stacione elektrike të Shpërndarjes	OSSH			100,000,000					100%	Perfunduar ne 2024
2.2024	Blerje pajisje sekondare për N/Stacione elektrike të Shpërndarjes	OSSH			250,000,000					100%	Perfunduar ne 2024
3.2024	Blerje pajisje për nyjet komutuese të Linjave dhe N/Stacione	OSSH			280,000,000					100%	Perfunduar ne 2025
4.2024	Blerje të pajisjeve komutuese për kabinet elektrike (Cela 20 kV)	OSSH			200,000,000					100%	Perfunduar ne 2025
5.2024	Blerje Transformatore Fuqie për Kabina elektrike	OSSH			150,000,000					100%	Perfunduar ne 2025
6.2024	Blerje Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresa TU + fishek	OSSH			54,000,000					100%	Perfunduar ne 2025
7.2024	Blerje Transformatore Instrumentale TU & TM (Transformator rryme TM&TU, Transformator Tensioni)	OSSH			53,000,000					100%	Perfunduar ne 2025
8.2024	Kabell ABC dhe aksesore	OSSH			230,000,000					100%	Perfunduar ne 2025
9.2024	Instalim Kontroll monitorim sistem kamera për N.Stacione	OSSH			150,000,000					100%	Perfunduar ne 2025
10.2024	Blerje kablli 35 kV XLPE (1x240)mm2	OSSH			30,000,000					100%	Perfunduar ne 2025
11.2024	Shpenzime për emergjencat	OSSH			100,000,000						

12.2025	Pajisje primare, sekondare dhe pajisje ndihmëse për N/stacione dhe Linjat TL	OSSH						200,000,000			200,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
13.2025	Celesa TL/TM, Ndaresa TL/TM dhe TT për ambient të jashtëm	OSSH						142,000,000			142,000,000	100%	Perfunduar ne 2026
14.2025	Cela 20 kV për N/Stacione	OSSH						280,600,000			280,600,000	16%	Ne proces Realizimi
15.2025	Pajisje transformuse, Transformator Fugjie dhe Cela 40.5 kV për N/Stacione	OSSH						153,500,000			153,500,000	98%	Ne proces Realizimi
16.2025	Blerje të pajisjeve komutuese për kabinat elektrike (Cela 20 kV)	OSSH						250,000,000			250,000,000	100%	
17.2025	Blerje Transformatore Fugjie për Kabina elektrike	OSSH						100,000,000			100,000,000	100%	
18.2025	Blerje Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresë TU + fishek	OSSH						40,000,000			40,000,000	100%	
19.2025	Blerje Automjeti me aparatura për testimin dhe gjetjen e defekteve të kabllove	OSSH						80,000,000			80,000,000		
20.2025	Kabell ABC dhe kabell TU	OSSH						210,000,000			210,000,000	100%	Perfunduar ne 2025
21.2025	Pajisje DGA për analizimin e gazrave në transformatore fugjie	OSSH						12,500,000			12,500,000	100%	
22.2025	Pajisje BMT për monitorimin e gazrave në transformator fugjie	OSSH						13,000,000			13,000,000		
23.2025	Transformatore tensioni të brendshëm për cela 35/20/10 kV për Nënstacione	OSSH						4,995,000			4,995,000		
24.2025	Box Metalik për ambient të jashtëm nënstationi të kompletuar me aksesore	OSSH						805,000			805,000		
25.2025	Pajisje rezistence tokezimi për neutrin e transformatoreve të fuqisë	OSSH						10,600,000			10,600,000		
26.2026	Pajisje primare, sekondare dhe pajisje ndihmëse për N/stacione dhe Linjat TL	OSSH						140,000,000			140,000,000		Lidhur Kontrata
27.2026	Celesa TL/TM, Ndaresa TL/TM dhe TT për ambient të jashtëm	OSSH						150,000,000			150,000,000		Ne faze prokurimi
28.2026	Cela 20 kV për N/Stacione	OSSH						160,000,000			160,000,000		Ne faze prokurimi
29.2026	Pajisje transformuse, Transformator Fugjie dhe Cela 40.5 kV për N/Stacione	OSSH						200,000,000			200,000,000	0%	Lidhur kontrata, ne pritje te realizimit sipas afateve

30.2026	DGA + BMT blerje	OSSH							50,000,000	0%	Lidhur kontrata, ne prrije te realizimit sipas afateve
31.2026	Sisteme survejimi me kamera CCVT faza II	OSSH							150,000,000		Ne faze prokurimi
32.2026	Paisjeve komutuese per kabinat elektrike (Çela 20 kV)	OSSH							200,000,000		Ne faze prokurimi
33.2026	Transformator Fuqie per Kabina elektrike	OSSH							100,000,000		Ne faze prokurimi
34.2026	Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresa TU + fisheke	OSSH							30,000,000		Ne faze prokurimi
35.2026	Kabell ABC dhe kabell TU	OSSH							250,000,000		Ne faze prokurimi
XI.2025	Oponence,leje ndertimi,shpronesime	OSSH						100,000,000	100,000,000		
2026	Oponence,leje ndertimi,shpronesime	OSSH							100,000,000		
2025	Emergjencia	OSSH						100,000,000	100,000,000		
2026	Emergjencia	OSSH							100,000,000		
XII	Mbikqyrje Punimesh per nevoja te OSSH sh.a	OSSH				70,000,000	38,000,000	30,665,428	138,665,428		
2024	Mbikqyrje supervizimi	OSSH					110,000,000		110,000,000	80%	
2025	Mbikqyrje supervizimi							100,000,000	100,000,000	40%	
2026	Mbikqyrje supervizimi	OSSH							100,000,000	0%	
TOTALI ME FONDET E OSSH			186,142,944	2,778,312,551	11,825,762,013	11,719,132,953	9,067,097,182	12,446,398,314	48,022,845,955		

Shenim: "Marketimet me ngjyre te njette ne statusin e realizimit te investimeve tregojne kontratat e lidhura sipas prokurimeve, te cilat perfshijne dy ose me shume zera investimesh."


Treguesit e performancës së rrjetit shpërndarës për vitin 2023-2025 dhe pritshmëria për vitet 2026, 2027.

Ecuria e treguesve SAIFI dhe SAIDI për rrjetin TL, TM dhe TU, si dhe për Total OSSH. Në periudhën 2023-2025 evidentohet ulje e treguesve totalë, ndërsa për vitet 2026-2027 parashikohet vijim i përmirësimit. Krahasuar me vitin 2025, pritshmëria për vitin 2027 është ulja e SAIFI nga 22.62 në 21.28 (rreth 5.9%) dhe e SAIDI nga 37.77 në 35.35 (rreth 6.4%).

Treguesit sipas viteve dhe nivelit të tensionit


Rrjeti	Realizimet 2023		Realizimet 2024		Realizimet 2025		Pritshmen 2026		Pritshme 2027	
	SAIFI	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI	SAIDI
TL	7.89	11.87	6.29	11.36	4.52	9.11	4.32	8.96	4.22	8.67
TM	21.60	36.70	19.65	32.05	16.74	27.18	16.04	25.63	15.76	25.25
TU	1.37	1.61	1.33	1.45	1.37	1.50	1.36	1.48	1.30	1.43
Total OSSH	30.86	50.18	27.26	45.13	22.62	37.77	21.72	36.07	21.28	35.35

Ecuria e SAIFI dhe SAIDI për Total OSSH

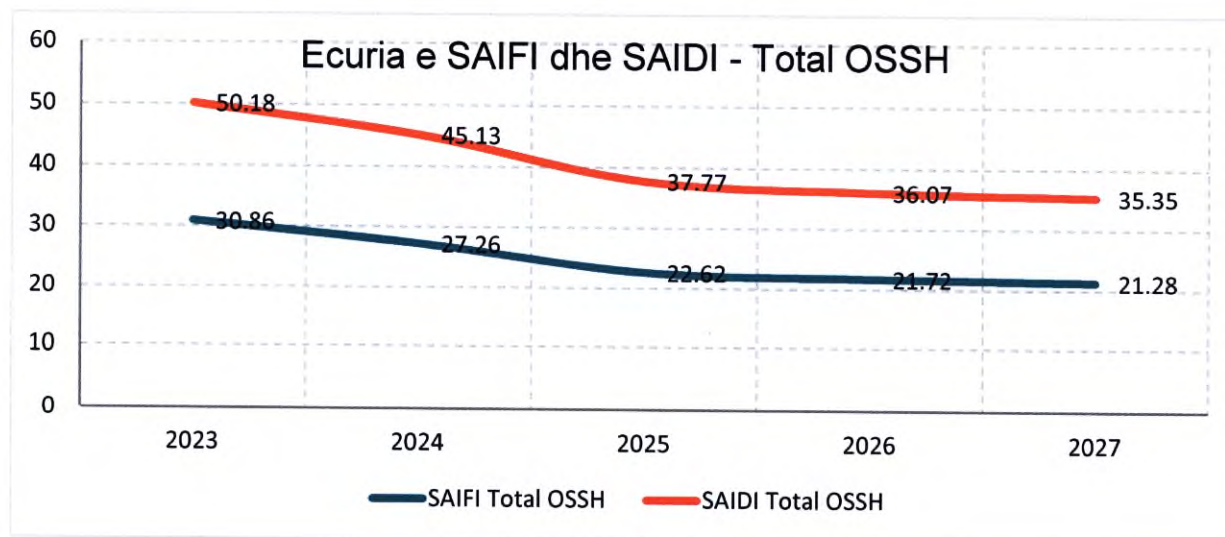

Impakti i pritshëm i investimeve

Rrjeti	SAIFI 2025	SAIFI 2027	Përmirësim SAIFI	Përmirësim SAIDI
TL	4.52	4.22	6.6%	4.8%
TM	16.74	15.76	5.8%	7.1%
TU	1.37	1.30	5.1%	4.7%
Total OSSH	22.62	21.28	5.9%	6.4%

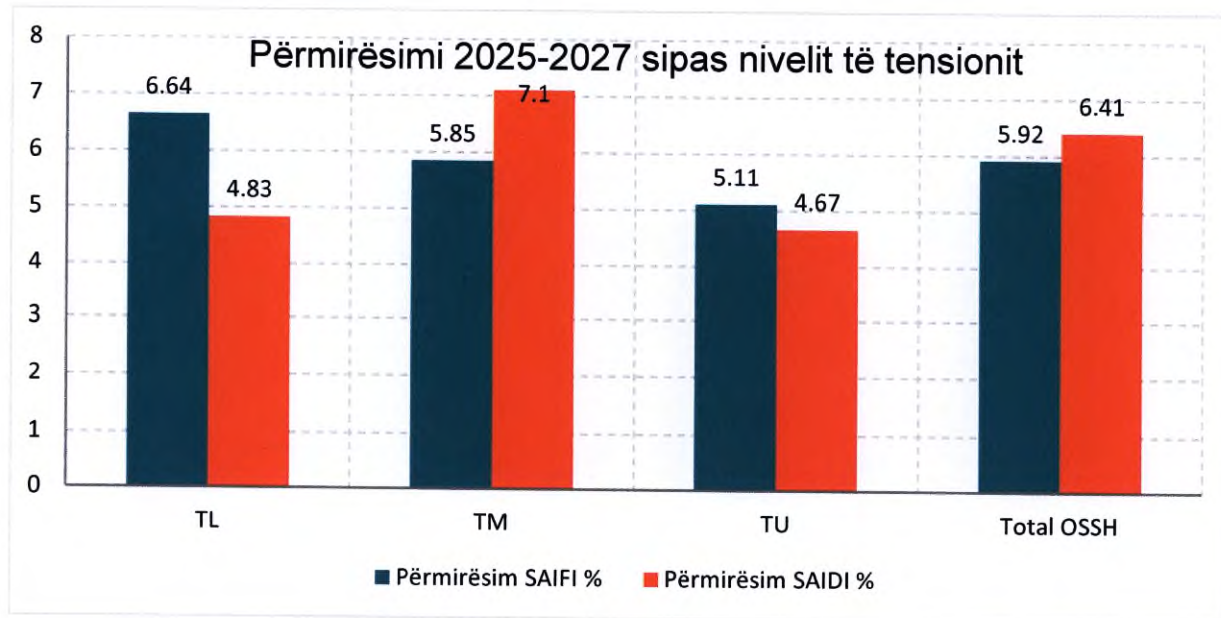


Përfundime


Ecuria e treguesve dëshmon një përmirësim progresiv të vazhdueshmërisë së furnizimit në rrjetin shpërndarës. Në nivel Total OSSH, SAIFI ulet nga 30.86 në vitin 2023 në 22.62 në vitin 2025 dhe parashikohet të arrijë 21.28 në vitin 2027. Në të njëjtën periudhë, SAIDI ulet nga 50.18 në 37.77 dhe pritjet të arrijë 35.35. Impakti relativ më i lartë në SAIDI rezulton në rrjetin TM, rreth 7.1%, çka mbështet prioritetin e ndërhyrjeve në rrjetin e tensionit të mesëm.

Humbjet e rrjetit shpërndarës 2023-2026 (8 mujor)

Treguesit vjetore të humbjeve në nivel rajoni dhe totali humbjeve në rrjetin e OSSH.sh.a, për periudhën 2023 - 2026, (viti 2026 është 8 mujore), ndërsa pritshmëritë janë që ky vit të mbyllet në nivelin prej 15.9% humbje në rrjetin e shpërndarjes.

Balanci Energjitik	VITI 2023		VITI 2024		VITI 2025		VITI 2026 (8 mujore)	
	Energji Totale ne rrjetin e OSSH (MWh)	Humbje (%)	Energji Totale ne rrjetin e OSSH (MWh)	Humbje (%)	Energji Totale ne rrjetin e OSSH (MWh)	Humbje (%)	Energji Totale ne rrjetin e OSSH (MWh)	Humbje (%)
Dr. Rajonale Tirane	2,528,530	12.59%	2,699,138	11.18%	2,831,669	10.31%	2,024,437	9.85%
Dr. Rajonale Durres	966,224	18.65%	996,164	17.48%	1,026,732	16.08%	738,516	14.78%
Dr. Rajonale Fier	459,211	13.08%	493,583	12.55%	557,850	10.51%	403,166	9.50%
Dr. Rajonale Elbasan	518,939	14.36%	518,678	13.46%	535,631	13.30%	399,597	10.99%
Dr. Rajonale Korce	409,800	13.48%	400,927	13.38%	412,913	13.24%	319,233	9.63%
Dr. Rajonale Gjirokastr	313,297	18.10%	341,166	17.29%	358,599	15.78%	266,968	14.65%
Dr. Rajonale Shkoder	705,988	33.51%	738,123	32.03%	768,492	31.29%	548,867	29.06%
Dr. Rajonale Berat	442,459	15.74%	449,398	15.45%	465,891	14.70%	359,747	12.29%
Dr. Rajonale Kukes	230,715	40.40%	220,225	42.42%	240,747	40.88%	187,674	34.90%
Dr. Rajonale Burrel	528,365	23.24%	522,485	23.98%	529,077	24.21%	389,758	22.56%
Dr. Rajonale Vlore	372,143	18.50%	395,534	17.00%	417,292	15.37%	323,106	14.65%
TOTAL ZONAT	7,475,669	17.87%	7,775,421	16.87%	8,144,893	15.94%	5,961,068	14.51%
Humbjet teknike ne TL	98,166	1.30%	101,039	1.28%	101,542	1.23%	77,460	1.28%
Konsumi NV. NJTL	4,451		4,553		4,985		3,523	
Humbjet totale ne rrjetin e OSSH (%)	7,578,286	18.93%	7,881,013	17.93%	8,251,420	16.96%	6,042,050	15.60%

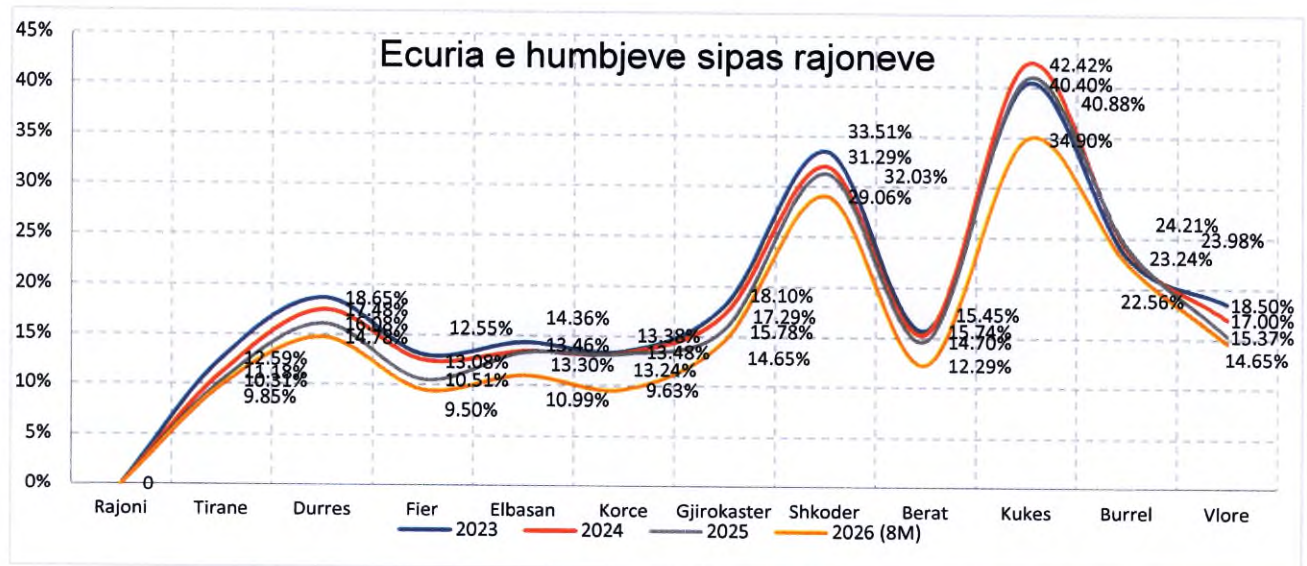

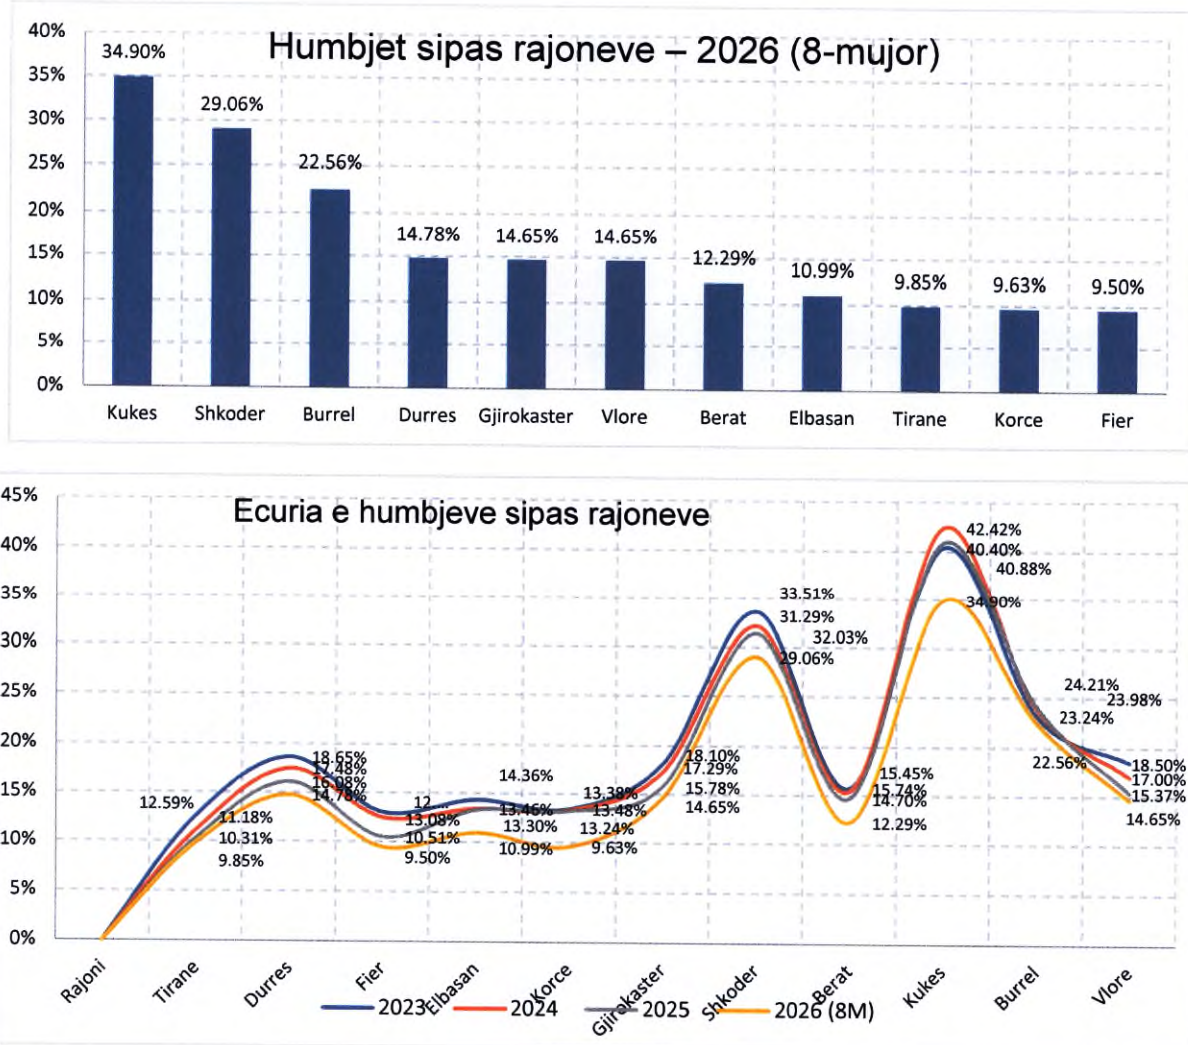

Klasifikimi i zërave të mëposhtëm si kosto kapitale apo kosto operative

- “Mbikëqyrje punimesh / Mbikëqyrje supervizimi” “Oponencë, leje ndërtimi, shpronësime”.

Këto zëra lidhen drejtpërdrejt me realizimin e investimeve dhe me procesin e ndërtimit e investimeve përkatëse. Kostot e tyre shpërndahet sipas objekteve të investimit përkatëse dhe kapitalizohen si pjesë e vlerës së investimit, si kosto kapitale.

Në tabelën e realizimit të planit të investimeve janë pasqyruar realizimet përkatëse të këtyre zërave.

- “Emergjencia

Zëri “Emergjencia” nuk klasifikohet automatikisht si kosto kapitale. Ai trajtohet sipas rastit në varësi të natyrës dhe efektit të ndërhyrjes. Ndërhyrjet që krijojnë ose përmirësojnë një aktiv dhe plotësojnë kriteret e kapitalizimit si pjesë e vlerës së investimit, do të paraqiten si

kosto kapitale dhe përfshihen në vlerën e investimit. Në tabelën e realizimit të planit të investimeve, ky zë nuk është paraqitur i realizuar, për rrjedhojë në këtë fazë nuk jepet klasifikimi konkret për të.

Publikimin e Planit të investimeve

Lidhur me transparencën, hapjen ndaj publikut dhe konsultimin e Planit të Investimeve, OSSH sh.a. sqaron se, në zbatim të kuadrit rregullator për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planeve të investimeve, ka ndërmarrë veprime konkrete për informimin dhe konsultimin e palëve të interesuara. Në këtë kuadër, OSSH sh.a. ka realizuar komunikime zyrtare shkresore me palë institucionale të interesuara, përfshirë Operatorin e Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.) dhe bashkitë përkatëse, duke u përcjellë informacion mbi planifikimin dhe zhvillimin e investimeve në rrjetin e shpërndarjes, si dhe duke marrë informacion mbi planet e tyre zhvillimore. Këto komunikime janë zhvilluar nëpërmjet korrespondencës zyrtare të protokolluar të ndërmarrë nga OSSH sh.a.

Bashkëlidhur kësaj shkrese po ju përcjellim komunikimet shkresore të OSSH sh.a. me OST sh.a. dhe bashkitë përkatëse, së bashku me përgjigjet e administruara nga institucionet përkatëse.

Në tabelën e mëposhtme po ju paraqesim komunikimet shkresore të kryera në kuadër të informimit institucional.

Nr.	Institucioni	Shkresa OSSH nr./datë	Objekti	Përgjigja nr./datë	Statusi
1	OST sh.a.	Nr. 2592. Prot., datë.03.03.2023	Mbi Planifikimin e Investimeve në n/st. për perjudhën 2023-2027		
2	OST sh.a.	Nr. 4052. Prot., datë.16.04.2024	Mbi Planifikimin e Investimeve në n/st. për perjudhën 2023-2027	Nr. 2249/1/2/3. Prot., datë.25.04.2024	Përgjigje e administruar
3	OST sh.a.	Nr. 2089/2. Prot., datë.29.01.2025	Planifikimin e Planit Investimeve 2024	Nr. 769/2. Prot., datë.28.02.2025	Përgjigje e administruar
4	Autoritetit Rrugor Shqiptarë	Nr. 5536. Prot., datë.27.05.2025	Kerkesë për bashkëpunim (në kuadër njoftimit të kordimit të investimeve)		
5	Bashkive, Lezhë, Himarë, Pogradec, Sarandë, Korçë, Kamëz, Berat, Gjirokastrë, Vlorë, Elbasan, Fier, Durrës, Tiranë, Shkodër.	Nr. 5363/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13. Prot., datë.23.05.2025	Kerkesë për bashkëpunim (në kuadër njoftimit të kordimit të investimeve)	Bashkia Tirane Nr. 19358/2. Prot., datë.20.06.2025	Përgjigje Bashkia Tirane administruar/ tjerat në pritje

Me konsideratë

ADMINISTRATORI OSSH sh.a.

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TË ASETETEVE

Nr. Prot.

6302/3

18 c8
Tiranë, më / / 2026

Lënda: Kthim përgjigje shkresës nr. 580/13 Prot., datë 04.08.2026, "Kërkesë për informacion plotësues në vijim të procesit të shqyrtimit të Planit 5-vjeçar të Zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për periudhën 2023–2027"

ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

(Rr. "Irfan Tomini", Njësia Administrative Nr. 7, Tiranë)

Për dijeni:

Z. Ervis HAZIZI

Zyrtari i Pajtueshmërisë, OSSH sh.a

Këtu

Të nderuar,

Në përgjigje të shkresës suaj nr. 580/13 Prot., datë 04.08.2026, me lëndë "Kërkesë për informacion plotësues në vijim të procesit të shqyrtimit të Planit 5-vjeçar të Zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për periudhën 2023–2027", dhe në vijim të korrespondencës së zhvilluar gjatë këtij procesi, OSSH sh.a. paraqet sqarimet plotësuese të mëposhtme. Këto sqarime mbështeten në dokumentacionin e administruar më parë, veçanërisht në shkresën nr. 1588/2 Prot., datë 27.04.2026, si dhe në shkresën nr. 6302/1 Prot., datë 16.06.2026, me të cilën OSSH sh.a. i është përgjigjur shkresës së ERE nr. 580/9 Prot., datë 02.06.2026.

Sqarojmë se një pjesë e çështjeve të ngritura në shkresën nr. 580/13 Prot. janë trajtuar dhe argumentuar më parë nga OSSH sh.a., përfshirë arsyet teknike dhe ekonomike të rishikimit, ndryshimet e komponentëve dhe parametrave teknikë, rritjen/uljen e kostove, riplanifikimin e investimeve dhe ndikimin e pritshëm në sigurinë, stabilitetin dhe cilësinë e furnizimit. Për këtë arsye, informacioni i përcjellë me shkresën nr. 6302/1 Prot., datë 16.06.2026, duhet të konsiderohet pjesë integrale e kësaj përgjigjeje; në vijim paraqiten sqarimet plotësuese për elementet e kërkuara rishtazi nga ERE.

1. Mbi arsyetimin teknik dhe financiar të ndryshimeve dhe përqendrimin e investimeve në vitin 2026

Sikurse është argumentuar me shkresën nr. 6302/1 Prot., datë 16.06.2026, ndryshimet e Planit për vitet 2026–2027 janë rezultat i rishikimit të Planit 5-vjeçar dhe i nevojës për përshtatjen e tij me gjendjen faktike të rrjetit, prioritetet teknike dhe kapacitetet reale të zbatimit. Në aspektin teknik, rishikimi është orientuar drejt rritjes së sigurisë së furnizimit, uljes së mbingarkesave, krijimit të lidhjeve unazore, fuqizimit/rikonstruksionit të nënstacioneve dhe zhvillimit gradual të rrjetit 20 kV. Në aspektin ekonomik, rishikimi synon saktësimin e vlerave të investimeve, rialokimin e tyre në kohë dhe përdorimin racional të burimeve financiare.

Në informacionin e përcjellë më parë është evidentuar se vlera e planifikuar për vitin 2026 është 9,067,097,182 lekë, me një shtesë prej 605,707,782 lekë kundrejt planifikimit të mëparshëm, ndërsa për vitin 2027 vlera është 12,446,398,314 lekë, me një shtesë prej 5,275,480,838 lekë. Diferenca totale prej 5,881,188,620 lekë lidhet kryesisht me: (i) rishikimin e vlerave të projekteve ekzistuese; (ii) përfshirjen e zërave të rinj të domosdoshëm; (iii) spostimin/rialokimin e afateve të zbatimit; dhe (iv) saktësimin e kostove pas projektimit dhe preventivimit.

Përqendrimi i disa kategorive të investimeve në vitin 2026 lidhet me nevoja teknike dhe operacionale të evidentuara gjatë rishikimit, me vijimësinë e projekteve të nisura ose të riplanifikuara dhe me domosdoshmërinë për të adresuar ndërhyrje që ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë dhe cilësinë e furnizimit. Për rrjedhojë, ky përqendrim nuk përbën shmangie nga logjika e Planit 5-vjeçar, por reflektim të ciklit konkret të realizimit të projekteve dhe të prioritetëve të rrjetit për vitin përkatës.

Fakti që një kategori ose vlerë e caktuar nuk përsëritet në të njëjtën masë në vitin pasues nuk nënkupton ndërprerje të objektivit të zhvillimit. Plani përmban si investime që përfundojnë brenda vitit të planifikuar, ashtu edhe investime të rialokuara ndërmjet viteve 2026 dhe 2027. Për këtë arsye, vlerësimi teknik dhe financiar duhet të bëhet në nivel projekti, faze dhe cikli zbatimi, dhe jo vetëm mbi bazën e përsëritjes nominale të një kategorie nga një vit në tjetrin.

2. Mbi lidhjen e investimeve me treguesit e performancës dhe objektivat e Planit

Në shkresën nr. 6302/1 Prot., datë 16.06.2026, OSSH sh.a. ka argumentuar ndikimin e kategorive kryesore të investimeve në sigurinë, stabilitetin dhe cilësinë e shërbimit. Investimet në nënstacione, fidera 20 kV, lidhje unazore, rrjet TM/TU, rrjet TU/ABC, matje inteligjente, SCADA dhe sistemet e monitorimit lidhen funksionalisht me reduktimin e energjisë së pafurnizuar (ENS), përmirësimin e treguesve SAIDI/SAIFI, uljen e humbjeve teknike, përmirësimin e cilësisë së tensionit dhe reduktimin e kohës së ndërhyrjes/riparimit.

Sipas parashikimeve të paraqitura në materialin e mëparshëm, ENS pritet të ulet nga 33,873 MËh në vitin 2026 në 33,196 MËh në vitin 2027; SAIDI nga 36.70 orë në 35.35 orë; SAIFI nga 21.72 në 21.28 ndërprerje/klient; ndërsa humbjet nga 16.96% në 16.50%, me kusht realizimin e investimeve sipas planit. Këto tregues demonstrojnë lidhjen funksionale të investimeve të propozuara me objektivat e performancës së rrjetit.

Gjithashtu, vlerësimi tekniko-ekonomik i projekteve është kryer mbi bazën e nevojës së rrjetit, ndikimit në sigurinë e furnizimit, cilësinë e shërbimit dhe realizueshmërinë operative. Përfitimet teknike lidhen me uljen e mbingarkesave, rezervimin dhe profilet e tensionit; përfitimet ekonomike me uljen e humbjeve dhe të energjisë së pafurnizuar; ndërsa përfitimet operacionale me rritjen e kontrollit të rrjetit dhe uljen e kohës së ndërhyrjes.

3. Mbi harmonizimin me objektivat dhe prioritetet e Strategjisë Kombëtare të Energjisë

Plani i investimeve është strukturuar në koherencë me objektivat e zhvillimit dhe modernizimit të rrjetit të shpërndarjes, rritjen e sigurisë dhe cilësisë së furnizimit, reduktimin e humbjeve në rrjet, integrimin e

teknologjive të monitorimit dhe matjes inteligjente, si dhe rritjen e eficiencës së operimit. Këto drejtime përputhen me prioritetet e evidentuara nga ERE në shkresën nr. 580/13 Prot. dhe përbëjnë bazën funksionale të përzgjedhjes dhe prioritizimit të investimeve.

Konkretisht, zhvillimi i rrjetit 20 kV dhe lidhjeve unazore rrit fleksibilitetin dhe rezervimin operacional; fuqizimi/rikonstruksioni i nënstacioneve rrit kapacitetin transformues dhe redukton mbingarkesat; eliminimi gradual i pjesëve të amortizuara 6 kV dhe 10 kV modernizon strukturën e rrjetit; investimet në SCADA, PoëerFactory dhe matjen inteligjente rrisin kontrollin, digjitalizimin dhe aftësinë për analizën e humbjeve; ndërsa rrjeti TU/ABC përmirëson cilësinë dhe qëndrueshmërinë e furnizimit.

4. Mbi zërat “Oponencë, leje ndërtimi, shpronësime”, “Emergjencia” dhe “Mbikëqyrje punimesh / Mbikëqyrje supervizimi”

Në Planin e përcjellë nga OSSH sh.a. këto zëra janë evidentuar si kategori të veçanta, përfshirë për vitin 2026: 100,000,000 lekë për “Oponencë, leje ndërtimi, shpronësime”, 100,000,000 lekë për “Emergjencia” dhe 100,000,000 lekë për “Mbikëqyrje supervizimi”.

Zërat “Oponencë, leje ndërtimi, shpronësime” dhe “Mbikëqyrje punimesh/Mbikëqyrje supervizimi” lidhen funksionalisht me përgatitjen, autorizimin dhe zbatimin e projekteve konkrete të investimit. Klasifikimi përfundimtar kontabël dhe rregullator i çdo shpenzimi si OPEX apo CAPEX, si dhe mënyra e kapitalizimit dhe e pasqyrimin në koston e projektit përkatës, duhet të mbështetet në natyrën e shpenzimit, lidhjen e drejtpërdrejtë me aktivin dhe dokumentacionin financiar të projektit. Për këtë qëllim, të dhënat do të rakordohen me strukturat financiare dhe kontabël përgjegjëse.

Për zërin “Emergjencia”, klasifikimi nuk mund të përcaktohet vetëm nga emërtimi i kategorisë. Trajtimi kontabël/rregullator varet nga natyra e ndërhyrjes konkrete: nëse ndërhyrja krijon ose përmirëson një aktiv dhe plotëson kriteret për kapitalizim, ajo trajtohet sipas rregullave përkatëse të koston kapitale; nëse lidhet me mirëmbajtjen, riparimin ose rikthimin e funksionimit pa krijuar/përmirësuar aktivin, trajtimi është operativ. Evidentimi përfundimtar do të paraqitet sipas rasteve konkrete, pas rakordimit përkatës.

5. Mbi burimet e financimit dhe strukturën e kapitalit

ERE, në shkresën nr. 580/13 Prot., evidenton se për periudhën 2023–2027 financimi i investimeve është planifikuar rreth 89% nga fondet e veta të shoqërisë dhe rreth 11% nga burime të huaja financimi. OSSH sh.a. merr në konsideratë që, për efekt të vlerësimit rregullator dhe përlogaritjes së Kostos Mesatare të Ponderuar

të Kapitalit (ĒACC), struktura e kapitalit dhe e borxhit do të trajtohet në përputhje me vendimin në fuqi për miratimin e tarifave të shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike.

6. Mbi realizimin faktik të investimeve deri më 30.06.2026

Kërkesa për evidentimin, për secilin zë/projekt investimi, të vlerës së planifikuar, vlerës së realizuar deri më 30.06.2026, përqindjes së realizimit dhe parashikimit të realizimit deri në fund të vitit përbën informacion faktik dhe dinamik, i cili nuk rezulton i plotë vetëm nga tabelat e Planit dhe nga argumentimi i përcjellë më parë. Për këtë arsye, ky informacion kërkon përditësim dhe rakordim me të dhënat e realizimit fizik, procedural, kontraktual dhe financiar.

Për të garantuar saktësinë dhe gjurmueshmërinë e të dhënave, si dhe për të shmangur mospërputhje ndërmjet planifikimit, angazhimeve kontraktuale, situacioneve të punimeve dhe realizimit financiar, rakordimi do të kryhet projekt më projekt me strukturat përgjegjëse. Pas përfundimit të tij, OSSH sh.a. do të paraqesë tabelën konsoliduese ;zëri/projekti; vlera e planifikuar për vitin 2026; realizimi deri më 30.06.2026; përqindja e realizimit; statusi fizik/procedural; dhe parashikimi i realizimit deri në fund të vitit 2026.

7. Mbi publikimin e Planit dhe informimin e palëve të interesuara

OSSH sh.a. merr në konsideratë kërkesën e ERE lidhur me nenin 6, pika "f", të rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve, për sa i përket publikimit të Planit dhe informimit të palëve të interesuara. Dokumentimi i mënyrës së publikimit në faqen zyrtare dhe i formave të përdorura për informimin/konsultimin e palëve të interesuara do të verifikohet me strukturat përgjegjëse dhe do t'i përcillet ERE-s si pjesë e dokumentacionit plotësues.

Ky element nuk ka qenë objekt i drejtpërdrejtë i përgjigjes së OSSH sh.a. me shkresën nr. 6302/1 Prot., datë 16.06.2026, e cila ishte fokusuar në ndryshimet e vlerave, parametrat teknikë, riplanifikimin dhe ndikimin në treguesit e performancës. Për rrjedhojë, evidencat për publikimin dhe informimin e palëve të interesuara do të plotësohen veçmas pas verifikimit përkatës.

8. Kërkesë për shtyrjen e afatit

Duke qenë se kërkesat e shkresës nr. 580/13 Prot. përfshijnë, krahas çështjeve të argumentuara më parë, edhe të dhëna të reja që kërkojnë përditësim deri më 30.06.2026, rakordim projekt më projekt të realizimit fizik dhe financiar, verifikim të klasifikimit OPEX/CAPEX dhe administrim të evidencave të publikimit dhe informimit të palëve të interesuara, përgatitja e një dokumentacioni të plotë dhe të verifikueshëm kërkon koordinim ndërmjet disa strukturave të OSHEE GROUP dhe OSSH sh.a.

Për sa më sipër, me qëllim që informacioni që do t'i paraqitet ERE-s të jetë i plotë, i rakorduar, i dokumentuar dhe i qëndrueshëm nga pikëpamja teknike, financiare dhe rregullatore, kërkojmë mirëkuptimin tuaj për shtyrjen me 30 (tridhjetë) ditë kalendarike të afatit për depozitimin e dokumentacionit plotësues të kërkuar me shkresën nr. 580/13 Prot., datë 04.08.2026.

Brenda këtij afati, OSSH sh.a. do të konsolidojë informacionin plotësues, duke ruajtur si bazë argumentimin dhe dokumentacionin e përcjellë më parë me shkresën nr. 6302/1 Prot., datë 16.06.2026, dhe duke shtuar evidencat, rakordimet dhe përditësimet e kërkuara rishtazi nga ERE.

Me konsideratë,

ADMINISTRATOR I OSSH sh.a.

Blendian DALIPI

ME AUTORIZIM TË POSAÇËM NR.9008 PROT. , DATË 07.08.2026

**DREJTOR DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT TË RRJETIT DHE
ASISTENCËS TEKNIKE**

Admirim LAKRA





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
DREJTORIA E TARIFAVE DHE ÇMIMEVE**

580/13
Nr. _____ Prot

Tiranë më 08/08.2026

Lënda: Kërkesë për informacion plotësues në vijim të procesit të shqyrtimit të 'Planit 5-vjeçar të Zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për periudhën 2023 – 2027'

**Z. BLENDIAN DALIPI
ADMINISTRATOR**

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES sh.a.

*(Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa nr. 88, H I, Kati V, Njësia Administrative Nr. 7, 1023,
Tiranë)*

Z. Administrator,

Në vijim të procesit të shqyrtimit të 'Planit 5-vjeçar të Zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për periudhën 2023 – 2027', si dhe referuar komunikimeve të deritanishme dhe seancave dëgjimore të zhvilluara ndërmjet përfaqësuesve të ERE-s dhe shoqërisë OSSH sh.a., vlerësohet e nevojshme plotësimi i mëtejshëm i informacionit dhe dokumentacionit shoqërues, me qëllim vijimin e procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të këtij plani, në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe me kërkesat e përcaktuara në "Rregulloren për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike".

Referuar nenit 6, pika "f" të rregullores së sipërcituar përcaktohet se: "Planet e investimeve do të jenë të hapura për publikun duke i'u dhënë mundësinë të interesuarve, përfshirë edhe institucionet e ndryshme shtetërore, të japin komentet e tyre lidhur me këto plane". OSSH sh.a. ka përcjellë informacion dhe dokumentacion mbi komunikimet me institucionet përkatëse, sikurse kërkuar dhe nga ERE me shkresën nr. 2904/1 prot., datë 05.12.2025. Megjithatë, në përputhje me kërkesat e shkresës së sipërcituar, mbetet e nevojshme të na informoni mbi mënyrën e publikimit të planit në faqen zyrtare të shoqërisë si dhe mbi format e ndjekura për informimin e palëve të interesuara.

Adresa: Rr. "Irfan Tomini", Njësia Administrative Nr. 7
E-mail erealb@ere.gov.al

Tel +355 42 69 590;
www.ere.gov.al

Nga shqyrtimi i përgjigjes së përcjellë nga shoqëria me nr. 6307/1 prot., datë 16.06.2026, protokolluar në ERE me nr. 580/11 prot., datë 18.06.2026, janë evidentuar disa ndryshime në planifikimin e disa zërave të investimeve. Konkretisht, për zërin "*Investime në matje dhe në sistemin e matjes*", rezulton se vlera e përditësuar e investimeve për vitin 2026 është rritur me rreth 290%, ndërkohë që për vitin 2027 nuk janë planifikuar investime për këtë kategori. Gjithashtu, për zërin "*Makineri, pajisje dhe zëra mbështetës*", vlera e përditësuar për vitin 2026 paraqet një rritje prej 1,430,000,000 lekësh, ndërsa për vitin 2027 është parashikuar vlerë zero.

Për sa më sipër, lutemi të paraqisni shpjegime mbi arsyetimin teknik dhe financiar të këtyre ndryshimeve, duke argumentuar nevojën për përqendrimin e këtyre investimeve në vitin 2026, ndërkohë që për periudhën pasuese nuk rezulton të ketë planifikim për këto kategori investimesh. Gjithashtu, duke qenë se 6-mujori i parë i vitit 2026 është mbyllur, lutemi të paraqisni informacion mbi nivelin e realizimit faktik të këtyre investimeve, duke evidentuar, për secilin zë investimi, vlerën e planifikuar, vlerën e realizuar deri më 30.06.2026, përqindjen e realizimit, si dhe parashikimin për përfundimin e investimit deri në fund të vitit.

Nga shqyrtimi i informacionit të përcjellë lidhur me burimet e financimit të investimeve të shoqërisë OSSH sh.a. për periudhën 2023–2027, rezulton se financimi i investimeve është planifikuar në masën rreth 89% nga fondet e veta të shoqërisë dhe rreth 11% nga burime të huaja financimi. Për sa më sipër, mbani në konsideratë se për efekt të vlerësimit rregullator dhe përlllogaritjes së Kostos Mesatare të Ponderuar të Kapitalit (WACC), ERE do të mbështetet në strukturën e kapitalit dhe të borxhit të konsideruar në vendimin në fuqi për miratimin e tarifave të shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike.

Lidhur me zërat "*Oponencë, leje ndërtimi, shpronësime*", "*Emergjencia*", "*Mbikqyrje punimesh për nevojat të OSSH sh.a.*" dhe "*Mbikqyrje supervizimi*", lutemi të na informoni mbi natyrën e këtyre zërave në kuadër të Planit të Investimeve të shoqërisë. Në mënyrë të veçantë, kërkohet të sqarohet nëse këto shpenzime klasifikohen si kosto operative apo kosto kapitale, si dhe të argumentohet lidhja e tyre me realizimin e projekteve konkrete të investimit, duke evidentuar mënyrën e përfshirjes dhe pasqyrimin të tyre në kostot e investimeve të planifikuara.

Në kuadër të vlerësimit të Planit, ERE konsideron të domosdoshme që planifikimi i investimeve të jetë i harmonizuar me objektivat dhe prioritetet e Strategjisë Kombëtare të Energjisë, duke garantuar zhvillimin dhe modernizimin e rrjetit të shpërndarjes, rritjen e sigurisë dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike, reduktimin e humbjeve në rrjet, integrimin e burimeve të rinovueshme të energjisë, si dhe digjitalizimin dhe rritjen e eficiencës së operimit të rrjetit.

Për këtë arsye, lutemi të paraqitet një analizë e përputhshmërisë së kategorive të investimit dhe projekteve kryesore të secilës kategori me objektivat e 'Strategjisë Kombëtare të Energjisë', duke evidentuar kontributin e secilit projekt në:

- Rritjen e sigurisë së furnizimit;
- Reduktimin e humbjeve;
- Integrimin e burimeve të rinovueshme;
- Digjitalizimin e rrjetit;
- Përmirësimin e cilësisë së shërbimit.

Për të vijuar me procesin e shqyrtimit të 'Planit 5-vjeçar të Zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për periudhën 2023 – 2027', lutemi që informacioni dhe dokumentacioni plotësues i kërkuar të përcillet në ERE brenda datës 14.08.2026.

Me respekt,

KRYETARI
Petrit AHMETI

NË MUNGESË DHE ME AUTORIZIM
ANËTAR I BORDIT
Petraq LIKA

Nr. 2532 Prot.

Tiranë, më 3/3/2023

Lënda : **Mbi Planifikimin e investimeve në Nënstacionet e OSSH-së për periudhën 2023-2027.**

Drejtuar: **Z. Skerdi DRENOVA**
Administrator
Operatori i Sistemit të Transmetimit

I nderuar,

Në zbatim të Kodit të Shpërndarjes, OSSH sh.a përcakton dhe planifikon zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes në lidhje me si më poshtë:

- Hartimin dhe planifikimin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilësinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- Përcaktimin e operimit të Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- Orientimin dhe nxitjen e investimeve me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Në vijim të sa më sipër OSSH sh.a ka bërë parashikimin e planit të investimeve për periudhën 5 vjeçare 2023 - 2027, për çdo Rajon, i cili konsiston në ndërtimet , fuqizimet e Nënstacioneve por dhe në drejtim të zgjerimit të rrjetit të shpërndarjes.

Në tabelën e mëposhtme në mënyrë analitike janë paraqitur investimet afat - shkurtër dhe afat - mesëm për ndërtimin dhe rikonstruksionin e Nënstacioneve, të ndara në Investime me Fondet e OSSH sh.a dhe ato me financime të Huaja.

Nr	Emertimi i objektit	Qyteti/ Komuna /Zona OSHEE	Nënstaci oni	Niveli i tensionit (kV)	Fuqia e instaluar MVA	Shtesa e fuqisë MVA nga investimi			Fuqia instaluar në n.stacion	Vitet e planifikuar a në planin 5-vjeçar 2023.....
						Afat shkurtër	Afat mesëm	Totali		
1	Investime OSSH									
1	Fuqizimi i N.Stacionit 110/20kV Golem - Durrës	Durrës	Golem	110/20/6	31.5/15/25MVA	40/50MVA (110/20)kV		(31.5/15/25MV A)+(40/50MVA (110/20)kV)	(31.5/15/25MV A)+(40/50MVA (110/20)kV)	2023
2	Ndërtimi i Nënstacionit të ri Velipoje 110/35/20kV	Shkoder	Velipoje	110/35/2 0kV	(20/25MVA 110/20)+(20/25M VA 110/35/20kV)	(20/25MVA 110/20)+(20/25MV A 110/35/20kV)		(20/25MVA 110/20)+(20/25 MVA 110/35/20kV)	(20/25MVA 110/20)+(20/25 MVA 110/35/20kV)	2023-2024

* Podrobnyy slovar' zhiznykh slov, 1959, kn. 1, s. 164; E. A. Balala, Administratsiya, No. 7, 1972, Tiraspol, Shkol'nyy MIPT, I 815200185.

2	Nenstacioni Spitallë	Gurres	Spitallë	110/20	(2x20/31.5)MVA (110/20)kV	(1x40/50)MVA (110/20)kV		(1x40/50)MVA (110/20)kV	(1x20/31.5)MVA A (110/20)kV (1x40/50)MVA (110/20)kV	2023-2024
5	Rikonstruksion i N/Stacionit Shkozë	Gurres	Shkozë	110/35/20/6	(1x20/20/10)MVA A (110/35/6) kV + (2x40)MVA (110/20)kV + (1x20/20/10) MVA (110/35/6) kV + (1x5.0)MVA (110/6)kV	TR.1 (1x40)MVA (110/35/20/6kV) TR.2 (1x40)MVA (110/35/20/6kV)		TR.1 (1x40)MVA (110/35/20/6kV) TR.3 (1x40)MVA (110/35/20/6kV) TR.4 (1x40)MVA (110/35/20/6kV)	TR.1 (1x40)MVA (110/35/20/6kV) TR.2 (1x40)MVA (110/35/20/6kV) TR.3 (1x40)MVA (110/35/20/6kV) TR.4 (1x40)MVA (110/35/20/6kV)	2023-2024
Kredi BCR2H										
1	Ndërtimi i N/Stacionit Qender	Tiranë	Qender	110/20	1x50/80		63/80 (110/20 kV)	2x40/80 (110/20 kV)	2x40/80 (110/20 kV)	2024-2026

Parashikimi i investimeve është bazuar edhe në studimin "Investment and Network Development Plan for the Electricity Distribution Sector in Albania", realizuar me financime të Donatorëve të Huaj.

Ashtu sic e kemi diskutuar dhe më parë vlen T'ju theksoj se për vitin 2023 kemi prioritet rajonin e Tiranës dhe në vecanti Nenstacionin e Zogut të Zi.

Duke qene se ky nënstation ka një rëndësi të vecante për furnizimin e qendrës së Kryeqytetit dhe për të përballuar rritjen e kërkesës për energji si pasojë e zhvillimeve të vullshme urbane do T'ju kërkoja që të merrni masa për furnizimin e këtij Nënstationi me linje 110 kV.

Jemi të gatshëm dhe të hapur për çfaredo lloj diskutimi dhe koordinimi të nevojshëm.

Duke ju uruar punë të mbarë,

Me konsideratë,

Blendian DALIPI

Administrator

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A.

Vera

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TË ASETETEVE

Nr. 5727 Prot.

Tiranë, më 30/05/2025

Lënda: Mbi Planifikimin e investimeve në nënstacionet dhe linjat TL të OSSH-së për vitin 2025.

ELISIAN BICI
ADMINISTRATOR
OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT
(Autostrada Tiranë -Durrës,Km9,Yrshek ,Kashar ,Tiranë)

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE GROUP SH.A
(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88,H. 1, 1023,Tiranë)

I nderuar,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar,Neni 75,në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër ju informojmë se Operatori i Sistemit të Shpërndarjes Sh.a ka përgatitur planin e investimeve për vitin 2025, i cili konsiston në ndërtimet, fuqizimet e nënstacioneve dhe zgjerimin e rrjetit të shpërndarjes.

Plani i investimeve për vitin 2025, është miratuar në Këshillin Mbikqyrës me Vendimin Nr.1, datë 14.02.2025 dhe në Asamblenë e Përgjithshme të Aksionarit me Vendimin Nr.2047/1, datë 21.03.2025, "Mbi miratimin e programit Financiar të OSHEE Group SH.A të konsoliduar (OSSH,FSHU,FTL dhe OSHEE GROUP Individual) për vitin 2025.

Më poshtë do të gjeni tabelën analitike të investimeve afat - shkurtër për ndërtimin e nënstacionit dhe linjave TL

Nr.	Emërtimi i Investimit	Qyteti/ Komuna /Zona OSHEE	TOTALI (lek)
I	Ndërtim/rikonstruksion elektrik për Nënstacionet		460,000,000
1	Ndërtimi i linjës re 35kV N.St Vukpalaj - Tamare, dhe N.Stacioni ri 35/10kV në Tamare.	Shkodër	460,000,000
II	Ndërtim/Rikonstruksion linjash të TL		1,147,300,000
1	Ndërtimi i linjës 35kV N.St Koplik 220kV - N.St Vukpalaj me dy qarqe..	Tiranë	310,000,000
2	Ndërtimi i linjës 35kV N.St 220kV Elbasan - Mjekës - Cerrujë - Gramsh.	DTL	600,000,000
3	Ndërtimi i Shtylles 110kV për lidhjen e nënstacionit të ri Kamëz 110/20kV me rrjetin 110 kV	DTL	7,300,000
4	Ndërtimi i linjës 35kV Kavajë - Rrogozhinë me një qark	DTL	230,000,000

Me konsideratë,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendi Dalipi



OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT
DREJTORIA E PLANIFIKIM ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT

Nr. 2249 prot.
3

Tiranë, më 25.04.2024

Lënda: Miratim në parim i kërkesës për pikën e lidhjes së Nënstacionit Piqeras me rrjetin e transmetimit

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SHA
Blv.Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr.88, H.1, Kati 5, Tiranë

Për dijeni:

OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SHA
Blv.Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr.88, H.1, Tiranë

Në vijim të komunikimeve dhe në përgjigje të shkresës Tuaj Nr.4252 Prot., më datë 16.04.2024, me anë të së cilës parashtroni ndërtimin e N/Stacionit të ri 110/20/10 kV Piqeras dhe lidhjen me rrjetin e transmetimit, me fuqi të instaluar të prozuar 2x20 MVA, Bashkia Himarë, dëshirojmë t'ju bëjmë me dije si më poshtë:

Lidhja e N/Stacionit 110/20/10 kV Piqeras, me fuqi të instaluar 2x20 MVA, referuar kërkesës tuaj, me rrjetin 110 kV të transmetimit, do të bëhet nëpërmjet ndërtimit të një linjë 110 kV me dy qarqe me përcjellës ACSR 240/40 mm², me gjatësi rreth 0.5 km, nga N/Stacioni 110/20/10 kV Piqeras deri në çarjen e linjës 110 kV Himarë-Sarandë në pikën e përshtatshme. Traktet e linjës 110 kV dhe traktet e transformatorëve në N/Stacionin 110/20/10 kV Piqeras duhet të jenë të pajisur me të gjithë elementët e nevojshëm primarë dhe sekondarë, në përputhje me Kodin e Rrjetit të Transmetimit/Kodin e Lidhjes dhe standartet e përdorura nga OST sh.a.

Projekti i plotë i zbatimit që përfshin çarjen e linjës elektrike ajrore 110 kV dhe N/Stacionin 110/20/10 kV Piqeras, duhet të miratohet nga OST SHA përpara fillimit të zbatimit të tij. OSSH SHA duhet të zbatojë të gjitha kushtet teknike të projektimit dhe të zbatimit të paisjeve dhe instalimeve elektrike në këtë investim. OST SHA do të jetë mbikqyrëse në të gjitha fazat e projekt-zbatimit të këtij investimi për pjesën që i përket daljeve të linjës 110 kV dhe impiantit 110 kV, deri në kolaudimin përfundimtar të tij.

OST do të ketë akses të plotë për të bërë në të ardhmen zgjerimin e N/Stacionit të ri 110/20/10 kV Piqeras me një dalje të re 110 kV, për nevoja të zhvillimit të sistemit të transmetimit sipas planvendosjes që ju keni përcjellë bashkëlidhur kësaj shkrese.

Të dhënat teknike të pajisjeve 110 kV që do të përdoren si dhe sistemi i kontrollit dhe mbrojtjes të transformatorëve ngritës 110/20/10 kV, duhet të jenë në konformitet të plotë

me publikimet më të fundit të standarteve IEC dhe EN. Specifikimet teknike të paisjeve 110 kV dhe atyre të kontrollit dhe mbrojtjes së elementeve të anës 110 kV të transformatorëve duhet të plotësojnë parametrat teknike kryesore sipas Kodit të Rrjetit të Transmetimit dhe miratuar nga OST.

Pika e matjes së energjisë elektrike për N/Stacionin e ri 110/20/10 kV Piqeras, me fuqi të instaluar 2x20 MVA (sipas Kodit të Matjes), do të jenë në daljet 110 kV të transformatorëve ngritës 110/20/10 kV me fuqi të instaluar 20 MVA, dhe duhet të plotësojnë standartin e kërkuar nga Kodi i Rrjetit të Transmetimit/Kodi i Matjes.


Për qëllime të drejtimit të centralizuar të sistemit elektro-energjetik dhe veprimeve operative të nevojshme, transformimet 110/20/10 kV në N/Stacionin e ri, përveç lidhjes direkte të telekomunikacionit me N/Stacionet 110/35/20 kV Himarë dhe 110/20 kV Sarandë, duhet të futet në sistemin SCADA të Qendrës Kombëtare Dispeçer. Të gjitha investimet që duhen për instalimin e paisjeve për këtë qëllim do të rakordohen me OST dhe duhet të përballohen nga OSSH SHA.

Përpara fillimit të punimeve për realizimin e kësaj lidhjeje, nga ana e shoqërisë aplikuese për lidhje me Rrjetin Kombëtar të Transmetimit, do të kryhet pagesa e Tarifave përkatëse sipas "Rregullores së procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit", miratuar me Vendim të ERE-s Nr.87, date 20.04.2018.

Pas nënshkrimit të "Marreveshjes së Lidhjes", OSSH SHA fillon punën për realizimin e projektit të zbatimit, ku pjesa që i përket impiantit 110 kV dhe pikës së lidhjes në rrjetin e transmetimit, duhet të dërgohen në kompaninë OST sh.a. përpara fillimit të implementimit për të marrë aprovimin teknik.

Ju faleminderit për mirëkuptimin,

ADMINISTRATORI i OST SHA



Skerdi Drenova

OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT
DREJTORIA E PLANIFIKIM ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT

Nr. 2243 prot.

Tiranë, më 25 .04.2024

Lënda: Miratim në parim i kërkesës për pikën e lidhjes së Nëstacionit Akërnë me rrjetin e transmetimit

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SHA
Blv.Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr.88, H.1, Kati 5, Tiranë

Për dijeni:

OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SHA
Blv.Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr.88, H.1, Tiranë

Në vijim të komunikimeve dhe në përgjigje të shkresës Tuaj Nr.4252 Prot., më datë 16.04.2024, me anë të së cilës parashtroni ndërtimin e N/Stacionit të ri 110/35/20 kV Akërnë dhe lidhjen me rrjetin e transmetimit, me fuqi të instaluar të prozuar 2x40/50 MVA, Bashkia Vlorë, dëshirojmë t'ju bëjmë me dije si më poshtë:

Lidhja e N/Stacionit 110/35/20 kV Akërnë, me fuqi të instaluar 20 MVA, referuar kërkesës tuaj, me rrjetin 110 kV të transmetimit, do të bëhet nëpërmjet ndërtimit të një linjë 110 kV me dy qarqe me përcjellës ACSR 240/40 mm², me gjatësi rreth 1.4 km, nga N/Stacioni 110/35/20 kV Akërnë deri në çarjen e linjës 110 kV Vlora1-Kafaraj në pikën e përshtatshme. Traktet e linjës 110 kV dhe trakti i transformatorit në N/Stacionin 110/35/20 kV Akërnë duhet të jenë të pajisur me të gjithë elementët e nevojshëm primarë dhe sekondarë, në përputhje me Kodin e Rrjetit të Transmetimit/Kodin e Lidhjes dhe standartet e përdorura nga OST sh.a.

Projekti i plotë i zbatimit që përfshin çarjen e linjës elektrike ajrore 110 kV dhe N/Stacionin 110/35/20 kV Akërnë, duhet të miratohet nga OST SHA përpara fillimit të zbatimit të tij. OSSH SHA duhet të zbatojë të gjitha kushtet teknike të projektimit dhe të zbatimit të paisjeve dhe instalimeve elektrike në këtë investim. OST SHA do të jetë mbikqyrëse në të gjitha fazat e projekt-zbatimit të këtij investimi për pjesën që i përket daljeve të linjës 110 kV dhe impiantit 110 kV, deri në kolaudimin përfundimtar të tij.

OST do të ketë akses të plotë për të bërë në të ardhmen zgjerimin e N/Stacionit të ri 110/35/20 kV Akërnë me një dalje të re 110 kV, për nevoja të zhvillimit të sistemit të transmetimit sipas planvendosjes që ju keni përcjellë bashkëlidhur kësaj shkrese.

Të dhënat teknike të pajisjeve 110 kV që do të përdoren si dhe sistemi i kontrollit dhe mbrojtjes të transformatorëve ngritës 110/35/20 kV, duhet të jenë në konformitet të plotë

me publikimet më të fundit të standarteve IEC dhe EN. Specifikimet teknike të paisjeve 110 kV dhe atyre të kontrollit dhe mbrojtjes së elementeve të anës 110 kV të transformatorëve duhet të plotësojnë parametrat teknike kryesore sipas Kodit të Rrjetit të Transmetimit dhe miratuar nga OST.

Pika e matjes së energjisë elektrike për N/Stacionin e ri 110/35/20 kV Akërnë, me fuqi të instaluar 20 MVA (sipas Kodit të Matjes), do të jetë në daljen 110 kV të transformatorit ngritës 110/35/20 kV me fuqi të instaluar 20 MVA, dhe duhet të plotësojnë standartin e kërkuar nga Kodi i Rrjetit të Transmetimit/Kodi i Matjes.

Për qëllime të drejtimit të centralizuar të sistemit elektro-energjetik dhe veprimeve operative të nevojshme, transformimet 110/35/20 kV në N/Stacionin e ri, përveç lidhjes direkte të telekomunikacionit me N/Stacionet 110/20/6 kV Vlora1 dhe 110/35/6 kV Kafaraj, duhet të futet në sistemin SCADA të Qendrës Kombëtare Dispeçer. Të gjitha investimet që duhen për instalimin e paisjeve për këtë qëllim do të rakordohen me OST dhe duhet të përballohen nga OSSH SHA.

Përpara fillimit të punimeve për realizimin e kësaj lidhjeje, nga ana e shoqërisë aplikuese për lidhje me Rrjetin Kombëtar të Transmetimit, do të kryhet pagesa e Tarifave përkatëse sipas "Rregullores së procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit", miratuar me Vendim të ERE-s Nr.87, date 20.04.2018.

Pas nënshkrimit të "Marreveshjes së Lidhjes", OSSH SHA fillon punën për realizimin e projektit të zbatimit, ku pjesa që i përket impiantit 110 kV dhe pikës së lidhjes në rrjetin e transmetimit, duhet të dërgohen në kompaninë OST sh.a. përpara fillimit të implementimit për të marrë aprovimin teknik.

Ju faleminderit për mirëkuptimin,

ADMINISTRATORI i OST SHA



OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT
DREJTORIA E PLANIFIKIM ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT

Nr. 2249/prot.

Tiranë, më 25.04.2024

Lënda: Miratim në parim i kërkesës për pikën e lidhjes së Nënstacionit Xarrë (Mursi) me rrjetin e transmetimit

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SHA
Blv.Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr.88, H.1, Kati 5, Tiranë

Për dijeni:

OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SHA
Blv.Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr.88, H.1, Tiranë

Në vijim të komunikimeve dhe në përgjigje të shkresës Tuaj Nr.4252 Prot., më datë 16.04.2024, me anë të së cilës parashtroni ndërtimin e N/Stacionit të ri 110/20/10 kV Xarrë dhe lidhjen me rrjetin e transmetimit, me fuqi të instaluar të prozuar 2x20 MVA, Bashkia Konispol, dëshirojmë t'ju bëjmë me dije si më poshtë:

Lidhja e N/Stacionit 110/20/10 kV Xarrë, me fuqi të instaluar 2x20 MVA, referuar kërkesës tuaj, me rrjetin 110 kV të transmetimit, do të bëhet nëpërmjet ndërtimit të një linjë 110 kV me dy qarqe (njëri qark do të instalohet përcjellës) me përcjellës ACSR 240/40 mm², me gjatësi rreth 18 km, nga N/Stacioni 110/20/10 kV Xarrë deri në N/Stacionin 110/20 kV Sarandë për t'u lidhur në zbarrat 110 kV të këtij nënstacioni. Traktet e linjës 110 kV dhe traktet e transformatorëve në N/Stacionin 110/20/10 kV Xarrë duhet të jenë të pajisur me të gjithë elementët e nevojshëm primarë dhe sekondarë, në përputhje me Kodin e Rrjetit të Transmetimit/Kodin e Lidhjes dhe standartet e përdorura nga OST sh.a.

Projekti i plotë i zbatimit N/Stacioni 110/20/10 kV Xarrë, duhet të miratohet nga OST SHA përpara fillimit të zbatimit të tij. OSSH SHA duhet të zbatojë të gjitha kushtet teknike të projektimit dhe të zbatimit të paisjeve dhe instalimeve elektrike në këtë investim. OST SHA do të jetë mbikqyrëse në të gjitha fazat e projekt-zbatimit të këtij investimi për pjesën që i përket impiantit 110 kV, deri në kolaudimin përfundimtar të tij.

OST do të ketë akses të plotë për të bërë në të ardhmen zgjerimin e N/Stacionit të ri 110/20/10 kV Xarrë me një dalje të re 110 kV, për nevoja të zhvillimit të sistemit të transmetimit sipas planvendosjes që ju keni përcjellë bashkëlidhur kësaj shkrese.

Të dhënat teknike të paisjeve 110 kV që do të përdoren si dhe sistemi i kontrollit dhe mbrojtjes të transformatorëve ngritës 110/20/10 kV, duhet të jenë në konformitet të plotë

me publikimet më të fundit të standarteve IEC dhe EN. Specifikimet teknike të paisjeve 110 kV dhe atyre të kontrollit dhe mbrojtjes së elementeve të anës 110 kV të transformatorëve duhet të plotësojnë parametrat teknike kryesore sipas Kodit të Rrjetit të Transmetimit dhe miratuar nga OST.

Pika e matjes së energjisë elektrike për N/Stacionin e ri 110/20/10 kV Xarrë, me fuqi të instaluar 2x20 MVA (sipas Kodit të Matjes), do të jenë në dalje të 110 kV të transformatorëve ngritës 110/20/10 kV me fuqi të instaluar 20 MVA, dhe duhet të plotësojnë standartin e kërkuar nga Kodi i Rrjetit të Transmetimit/Kodi i Matjes.


Për qëllime të drejtimit të centralizuar të sistemit elektro-energetik dhe veprimeve operative të nevojshme, transformimet 110/20/10 kV në N/Stacionin e ri, përveç lidhjes direkte të telekomunikacionit me N/Stacionin 110/20 kV Sarandë, duhet të futet në sistemin SCADA të Qendrës Kombëtare Dispeçer. Të gjitha investimet që duhen për instalimin e paisjeve për këtë qëllim do të rakordohen me OST dhe duhet të përballohen nga OSSH SHA.

Përpara fillimit të punimeve për realizimin e kësaj lidhjeje, nga ana e shoqërisë aplikuese për lidhje me Rrjetin Kombëtar të Transmetimit, do të kryhet pagesa e Tarifave përkatëse sipas "Rregullores së procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit", miratuar me Vendim të ERE-s Nr.87, date 20.04.2018.

Pas nënshkrimit të "Marreveshjes së Lidhjes", OSSH SHA fillon punën për realizimin e projektit të zbatimit, ku pjesa që i përket impiantit 110 kV dhe pikës së lidhjes në rrjetin e transmetimit, duhet të dërgohen në kompaninë OST sh.a. përpara fillimit të implementimit për të marrë aprovimin teknik.

Ju faleminderit për mirëkuptimin,

ADMINISTRATORI i OST SHA



Skerdi Drenova



OST
OPERATORI
I SISTEMIT TË
TRANSMETIMIT

OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT
DREJTORIA E PLANIFIKIM ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT ✓

Nr. 769/ prot.
2

Tiranë, më 28.02.2025

Lënda: Kthim përgjigje shkresës Nr.769 Prot., datë 31.01.2025, "Kërkesë për Bashkëpunim"

Z. Blendian Dalipi

ADMINISTRATOR I OSSH sh.a.

Blv. "Gjergj Fishta", Nd. Nr.88, H. 1, Njësia

Administrative Nr.7, 1023 Tiranë, Shqipëri

I nderuar Z. Dalipi,

Në përgjigje të shkresës Tuaj me Nr.2089/2 Prot, datë 29.01.2025, protokolluar në OST sh.a. me Nr.769 prot, datë 31.01.2025, në të cilën listoni kërkesën për lidhje në rrjetin 110 kV Ju bëjmë me dije se:

1. Ndërtimi i Nënstacioni të ri Velipojë 110/35/20 kV

Për këtë objekt: "Instalimi i qarkut 110 kV në linjën egzistuese Bushat – Velipojë trakti përkatës në N/St. Bushat", ka një kontratë të lidhur me Nr.3041/13 Prot. Dt.31.10.2024 e cila është në fazën e aprovimit të projekt zbatimit.

2. Fuqizimi i Nënstacionit 110/20 kV Zogu Zi (2x40) MVA

Për këtë objekt: "Ndërtimi i linjës kabllore 110 kV Tirana 1 – Zogu i Zi si dhe trakti përkatës në N/St. Tirana 1", ka një kontratë të lidhur me Nr.3/1 Prot, dt.10.01.2025 e cila është në fazën e hartimit të projekt zbatimit.

3. Ndërtim i Nënstacionit të ri Fier 2 110/20 kV

Ky investim ka nisur procedurat për hartimin e specifikimeve teknike dhe më pas do të vazhdojë me procedurat e tjera.

4. Ndërtimi i Nënstacionit të ri Akërne 110/35/20 kV dhe zhvillimi i linjës 35 kV Nënstacioni Akërne- Aeroporti Vlorës.

Për këtë objekt: "Furnizimi i N/St. Akërne 110/35/20 kV me tension 110 kV", ka një kontratë të lidhur me Nr.4491/12 Prot, dt.24.12.2024 e cila është në fazën e hartimit të projekt zbatimit.

Me respekt,

ADMINISTRATORI I OST sh.a



Nr. 4252 Prot.

Tiranë, më 16/04/ 2024

Lënda : **Mbi Planifikimin e investimeve në nënstacionet e OSSH-së për vitin 2024.**

Drejtuar: **Z. Skerdi DRENOVA**
Administrator
OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT SH.A

Për Dijeni: **Z. Enea KARAKAÇI**
Administrator
OSHEE GROUP SH.A

I nderuar,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilësinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit

Ju informojmë se Operatori i Sistemit të Shpërndarjes Sh.a ka përgatitur planin e investimeve për vitin 2024, për çdo Rajon, i cili konsiston në ndërtimet , fuqizimet e nënstacioneve dhe zgjerimin e rrjetit të shpërndarjes.

Më poshtë do të gjeni tabelën analitike të investimeve afat - shkurtër për ndërtimin dhe rikonstruksionin e nënstacioneve së bashku me koordinatat në sistemin UTM, ku do të ndërtohen këto nënstacione.

Nr	Emërtimi i objektit	Qyteti/ Komuna / Zona OSHEE	Nënstacioni	Niveli i tensionit (kV)	Fuqia e instaluar MVA	Shtesa e fuqisë MVA nga investimi		Vitet e planifikua ra në planin e vitit 2024
						Afat shkurter	Totali	
1	Rikonstruksion dhe fuqizim i Nënstacioni Kafaraj 110/35/6 kV	Fier	Kafaraj	110/35/6 kV	10MVA 110/35/6kV + 5.6MVA 35/6kV	(2x40/50)MV A (110/35/6)k V	(2x40/50)M VA (110/35/6)k V	2024
2	Zhvillimi i linjës me dy qarqe 35kV(me izolacion 110 kV),nënstacionit Kafaraj Fier - Hoxharë (traseja e linjës ekzistuese 35kV)	Fier - Hoxhare		110kV				2024
3	"Ndërtimi i Nënstacionit të ri Akërnj 110/35/20kV dhe zhvillimi i linjës 35kV N/stac Akërnj- Aeroporti Vlorës"	Akërnj/Vlore	Akërnj	110/35/2 0kV		20MVA 110/35/20	20MVA 110/35/20	2024
4	Ndërtim i nënstacioni të ri Xarë 110/20/10kV	Vlorë/Konisp ol/Xarrë	Xarrë	110/20/1 0kV		(2x20) MVA 110/20/10 kV	(2x20) MVA 110/20/10 kV	2024
5	Ndërtim i nënstacioni të ri Piqeras 110/20/10kV	Vlorë/Himar ë/Piqers	Piqeras	110/20/1 0kV		20 MVA 110/20/10 kV	20 MVA 110/20/10 kV	2024

- Koordinatat e nënstacionit të ri Akërnj 110/35/20kV,

Nr	X	Y
1	369837.232	4495828.970

- Koordinatat e nënstacionit të ri Xarrë 110/20/10kV

Nr	X	Y
1	421806.38	4494396622.83

- Koordinatat e nënstacionit të ri Piqeras 110/20/10kV

Nr	X	Y
1	491862.76	4430600.79

Duke ju falenderuar për bashkëpunimi, jemi të gatshëm për çdo diskutim dhe koordinim të nevojshëm në lidhje me nënstacionet e sipërcituara.

Me respekt,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363 Prot.

Tiranë, më 28/05 /2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

PJERIN NDREU
KRYETAR
BASHKIA LEZHË

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

E nderuar z.Ndreu,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilësinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".



Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm, kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proces apo të planifikuara, për vitin 2026, në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5263/Prot.

Tiranë, më 23/05/2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

VANGJEL TAVO
KRYETAR
BASHKIA HIMARË

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

I nderuar z.Tavo ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilësinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proces apo të planifikuara, për vitin 2026 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363/Prot.
2

Tiranë, më 23/05/2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

ILIR XHAKOLLI
KRYETAR
BASHKIA POGRADEC

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

I nderuar z.Xhakolli ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proçes apo të planifikuara, për vitin 2026 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363 / Prot.
3

Tiranë, më 22 / 05 / 2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

OLTION ÇAÇI
KRYETAR
BASHKIA SARANDË

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

I nderuar z. Çaçi, ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilësinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proçes apo të planifikuara, për vitin 2026 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363/Prot.
4

Tiranë, më 28/01/2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

SOTIRAQ FILO
KRYETAR
BASHKIA KORÇË

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

I nderuar z.Filo ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm, kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proces apo të planifikuara, për vitin 2026, në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363 / Prot.
5

Tiranë, më 23/05 /2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

**RAKIP SULI
KRYETAR
BASHKIA KAMËZ**

**Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.**

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

I nderuar z.Suli ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilësinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proçes apo të planifikuara, për vitin 2026 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363 / Prot.
76

Tiranë, më 20 / 05 / 2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

BASHKISË BERAT

**Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.**

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

Të nderuar,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm, kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proces apo të planifikuara, për vitin 2026, në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363/Prot.
7

Tiranë, më 23/5/2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

**FLAMUR GOLEMI
KRYETAR
BASHKIA GJIROKASTËR**

**Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.**

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

I nderuar z. Golemi ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363 / Prot.
8

Tiranë, më 28/05 /2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

ERMAL DREDHA
KRYETAR
BASHKIA VLORE

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

I nderuar z.Dredha ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilësinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proçes apo të planifikuara, për vitin 2026 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendi DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5063/Prot.

Tiranë, më 13/05/2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

GLEDIAN LLATAJ
KRYETAR
BASHKIA ELBASAN

**Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.**

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

I nderuar z.Llataj ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proces apo të planifikuara, për vitin 2026 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendi DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5063 / Prot.
10

Tiranë, më 23/05 /2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

ARMANDO SUBASHI
KRYETAR
BASHKIA FIER

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

I nderuar z.Subashi ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:


" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proces apo të planifikuara, për vitin 2026 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363 / Prot.

Tiranë, më 28/05 /2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

EMIRIANA SAKO
KRYETARE
BASHKIA DURRËS
(Sheshi Liria 15)

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88,H. 1, 1023,Tiranë)

E nderuar znj.Sako,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar,Neni 75,në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proçes apo të planifikuara, për vitin 2026 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363 / Prot.

Tiranë, më 23 / 05 / 2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

BASHKISË TIRANË

**Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.**

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

Të nderuar,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proçes apo të planifikuara, për vitin 2026 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5363 Prot.

Tiranë, më 20/08/2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

**BENET BECI
KRYETAR
BASHKIA SHKODËR**

**Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.**

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

I nderuar z.Beci,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilësinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2026 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proces apo të planifikuara, për vitin 2026 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALLI



BASHKIA TIRANË
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMT TË INVESTIMEVE DHE
MONITORIMIT TË PUNËVE PUBLIKE
DREJTORIA E RRJETEVE DHE PLANIFIKIMT TË PUNËVE PUBLIKE

Nr. 19358/prot.

Tiranë, më 206, 2025

Lënda: Mbi vënien në dispozicion të informacionit mbi investimet e planifikuara

DEPARTAMENTIT TË MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TË ASETETEVE
OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H.1, Kati 5, Njesia Administrative Nr.7, 1023,
Tiranë

Në përgjigje të shkresës suaj me nr.prot. 5363/12, datë 23.05.2025, protokolluar pranë Bashkisë Tiranë, me nr.prot. 19358, datë 26.05.2025, në të cilën është paraqitur kërkesa për bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës mbi vënien në dispozicion të informacionit mbi investimet në infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proces, apo të planifikuara për vitin 2026, në zbatim të bazës ligjore, si dhe në kuadër të planifikimit dhe zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes, ju dërgojmë:

Informacion me zonat e planifikuara për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore nga investime të realizuara, apo të planifikuara sipas planeve buxhetore të miratuara nga Bashkia Tiranë, nga viti 2021, e në vazhdim.

Materiali Ju dërgohet bashkëngjitur me CD, në formatet:

- Harta për Tiranën urbane dhe për territorin e plotë në administrim, në .pdf;
- Informacion i digjitalizuar, i përdorshëm për programin GIS, në shape file, në sistemin koordinativ CRS EPSG:32634 - WGS 84 / UTM zone 34N – Projected;
- Listë tabelare të investimeve, në Microsoft Excel;

Ju vëmë në dijeni, se kjo kërkesë i është dërguar gjithashtu për trajtim Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, pranë Bashkisë Tiranë, mbi planifikimin zhvillimor urban të territorit.

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË
Eldi Hoxha

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 5536 Prot.

Tiranë, më 14/05/2025

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

(Rruga Sami Frasheri, Nr.33, Tirane Tirana AL, 1060)

**Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.**

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88,H. 1, 1023,Tiranë)

Të nderuar ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar,Neni 75,në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, OSSH-sha e specializuar në projektimin dhe implementimin e sistemeve elektrike, shpreh interesin për bashkëpunim me Autoritetin Rrugor Shqiptar, në procesin e njoftimit dhe koordinimit të investimeve në infrastrukturën rrugore.

Duke qenë se përmirësimi i rrjetit rrugor është një prioritet kombëtar, është e domosdoshme të parashikohet nevoja për hartimin e projekteve elektrike të përshtatshme, në mënyrë që të garantohet funksionaliteti optimal i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike.

Për këtë arsye, sugjerojmë një bashkëpunim të ngushtë, me qëllim shkëmbimin e informacionit mbi investimet e planifikuara dhe harmonizimin e nevojave infrastrukturore.

Ky informacion është i vlefshëm për OSSH-në që në fazën e Projekt Idesë paraprake, në mënyrë që të azhurnojë në kohë rrjetin elektrik ekzistues si dhe investimet e planifikuara. Shpresojmë në një bashkëpunim të vazhdueshëm në çdo etapë të implementimit të projekteve, për problemetikat që mund të dalin me rrjetin elektrik të OSSH-së.

Ky bashkëpunim do të sjellë përfitime të ndërsjellta duke eliminuar kostot shtesë në kryerjen e investimeve publike, duke shmangur ndërhyrje të panevojshme në infrastrukturë.

Me respekt,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TE ASETETEVE

Nr. 143 / Prot.

Tiranë, më 22 / 04 / 2026

Lënda: Kërkesë për bashkëpunim.

BRUNILDA MERSINI
KRYETARE
BASHKIA VLORE

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE
GROUP SH.A.

(Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, Tiranë)

E nderuar zj. Mersini ,

Në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Kodit të Shpërndarjes, Kapitulli II-"Planifikimi", ku specifikohen kriteret dhe procedurat që do të zbatohen nga OSSH Sh.a.për planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes, pika II.1 "Qëllimi", II.1.1, ku planifikimi i zhvillimit të Sistemit të Shpërndarjes ka qëllimet :

- i. Të hartojë planin e zhvillimit perspektiv të Sistemit të Shpërndarjes, për të qenë i aftë të shpërndajë energjinë elektrike në sasinë dhe cilesinë, e kërkuar prej Përdoruesve
- ii. Të përcaktojë operimin e Sistemit të Shpërndarjes sipas kushteve të sigurisë, si dhe të krijojë garancitë për të lejuar shpërndarjen e energjisë elektrike në nivelet e kërkuara të cilësisë.
- iii. Të orientojë dhe të nxisë investimet me efikasitet në Sistemin e Shpërndarjes, nëpërmjet inicimit të procedurave të nevojshme si dhe të mbledhë dhe përpunojë informacionin e nevojshëm për hartimin e planit të zhvillimit të sistemit.

Gjithashtu po në zbatim të Ligjit Nr.43/2015, " Për Sektorin e Energjisë Elektike", i ndryshuar, Neni 75, në pikën 3 thuhet:

" Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, gjatë hartimit të planit, merr në konsideratë zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe planifikimin urban dhe rajonal për zonën ku do të zhvillohet sistemi i Shpërndarjes".

Sa më sipër, për hartimin e planit të investimeve për vitin 2027 dhe planit afat mesëm , kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për vënien në dispozicion të një informacioni në lidhje me investimet për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimore në proces apo të planifikuara, për vitin 2027 ,në Bashkinë Tuaj.

Faleminderit,

ADMINISTRATOR I OSSH/SH.A

Blendian DALIPI

